


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001/2025 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE COLONIA 28 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,		
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001 A/2025
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 25 de febrero de 2025
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Días de Obra:</b>	21
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Inicio Real:</b>	martes, 25 de febrero de 2025
		<b>Monto Contratado:</b>	\$ 117,757.40
		<b>Fin Vigente:</b>	lunes, 17 de marzo de 2025
		<b>Monto Ejercido:</b>	\$ 117,757.40
		<b>Fin Real:</b>	lunes, 17 de marzo de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/02/2025	30.09%	30.09%	0.00%
2	07/03/2025	84.88%	84.88%	0.00%
3	14/03/2025	93.05%	93.05%	0.00%
4	21/03/2025	100.00%	100.00%	100.00%

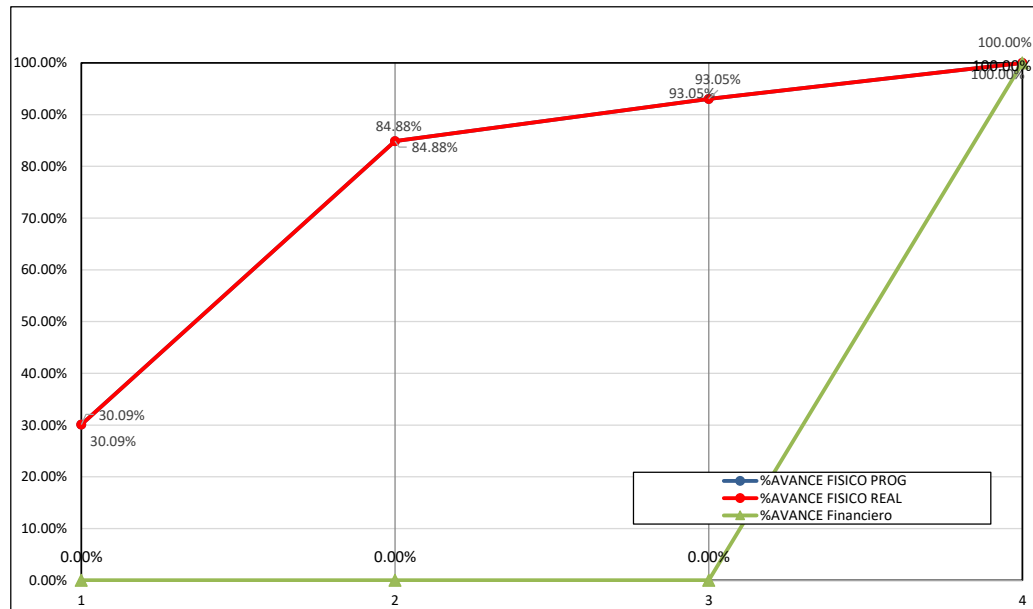

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
