


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP24 001/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y CICLOVIA EN CALLE 21 DE MARZO TRAMO 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP24 001/2025
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,
Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA **Inicio Vigente:** viernes, 20 de junio de 2025 **Días de Obra:** 90
Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y RANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO **Inicio Real:** viernes, 20 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$ 4,546,562.35
Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO **Fin Vigente:** miércoles, 17 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**
Fin Real: miércoles, 17 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2025	3.10%	3.12%	50.00%
2	01/07/2025			
3	08/07/2025			
4	15/07/2025			
5	22/07/2025			
6	29/07/2025			
7	05/08/2025			
8	12/08/2025			
9	19/08/2025			

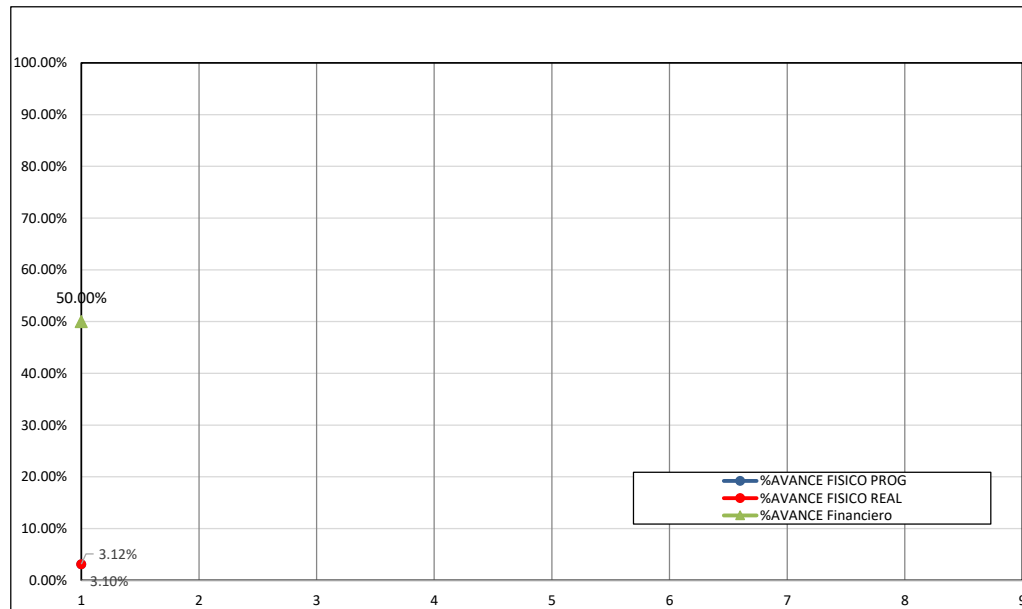

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
