

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP24 002/2025 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA 28 DE ABRIL.

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** IP24 002/2025

**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2025  
**Programa:** SE URBANIZACIÓN

**Contratista:** OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  
**Inicio Vigente:** viernes, 20 de junio de 2025

**Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 07 PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS

**Inicio Real:** viernes, 20 de junio de 2025

**Monto Contratado:** \$2,447,810.33


**Residente:** ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

**Fin Vigente:** lunes, 18 de agosto de 2025

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** lunes, 18 de agosto de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2025	2.07%	2.98%	50.00%
2	01/07/2025			
3	08/07/2025			
4	15/07/2025			
5	22/07/2025			
6	29/07/2025			
7	05/08/2025			
8	12/08/2025			
9	19/08/2025			

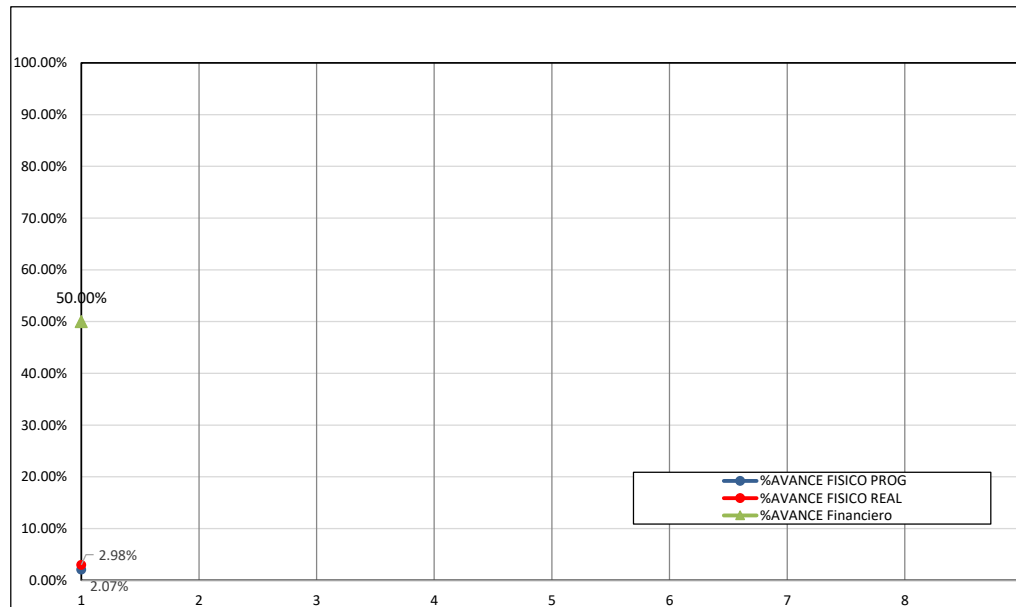

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
