


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP24 005/2025 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA TRAMO DE CALLE VILLA DEL CARBON A CALLE VILLA VERMOSA SAN FELIX DE JUAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP24 005/2025
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.
Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** miércoles, 25 de junio de 2025 **Días de Obra:** 75
Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y RANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO **Inicio Real:** miércoles, 25 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$3,032,622.44
Residente: ING. JUAN BELMARES VENTURA **Fin Vigente:** domingo, 7 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**
Fin Real: domingo, 7 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/06/2025	2.05%	2.16%	50.00%
2	06/07/2025			
3	13/07/2025			
4	20/07/2025			
5	27/07/2025			
6	03/08/2025			
7	10/08/2025			
8	17/08/2025			
9	24/08/2025			

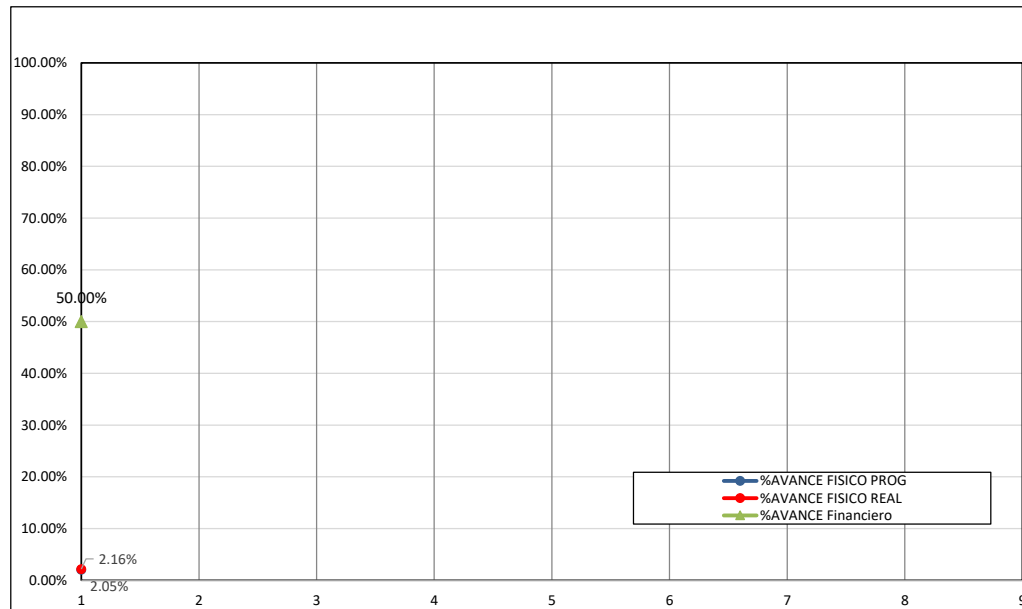

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
