


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 001/2025 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE COLONIA 28 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 001 A/2025  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.  
**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** martes, 25 de febrero de 2025 **Días de Obra:** 21  
**Subprograma:** 03 SERVICIOS **Inicio Real:** martes, 25 de febrero de 2025 **Monto Contratado:** \$ 117,757.40  
**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** lunes, 17 de marzo de 2025 **Monto Ejercido:** \$ 117,757.40  
**Fin Real:** lunes, 17 de marzo de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/02/2025	30.09%	30.09%	0.00%
2	07/03/2025	84.88%	84.88%	0.00%
3	14/03/2025	93.05%	93.05%	0.00%
4	21/03/2025	100.00%	100.00%	100.00%

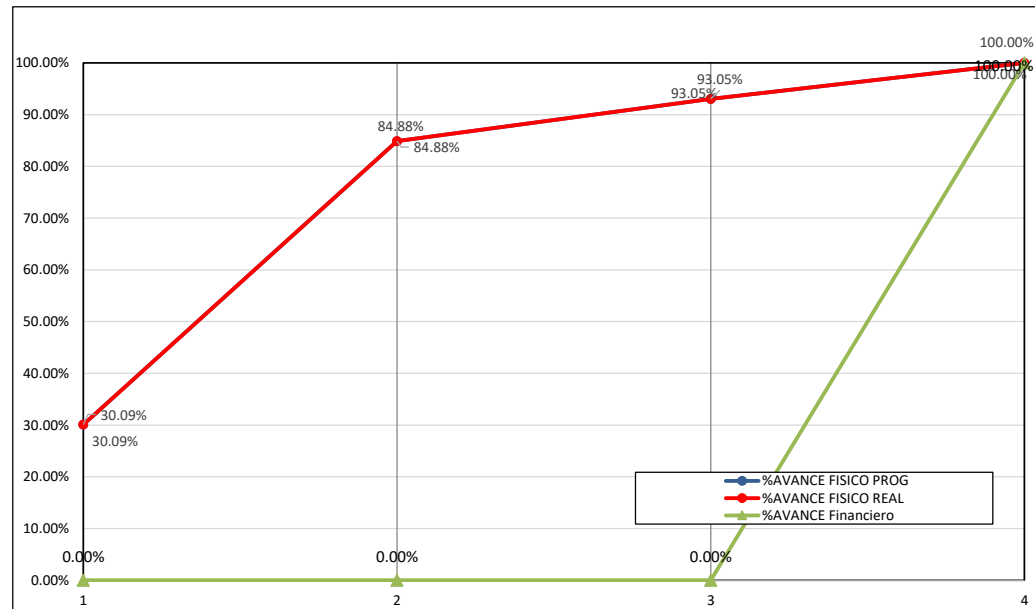

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
