


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 F/2025 PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 001 F/2025
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ TOLEDO
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** sábado, 24 de mayo de 2025 **Días de Obra:** 60
Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** sábado, 24 de mayo de 2025 **Monto Contratado:** \$ 109,662.08
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** martes, 22 de julio de 2025 **Monto Ejercido:**
Fin Real: martes, 22 de julio de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2025	11.66%	11.66%	0.00%
2	07/06/2025	23.34%	23.34%	0.00%
3	14/06/2025	35.01%	35.01%	0.00%
4	21/06/2025	46.70%	46.70%	0.00%
5	28/06/2025	58.34%	58.34%	0.00%
6	05/07/2025			
7	12/07/2025			
8	19/07/2025			
9	26/07/2025			

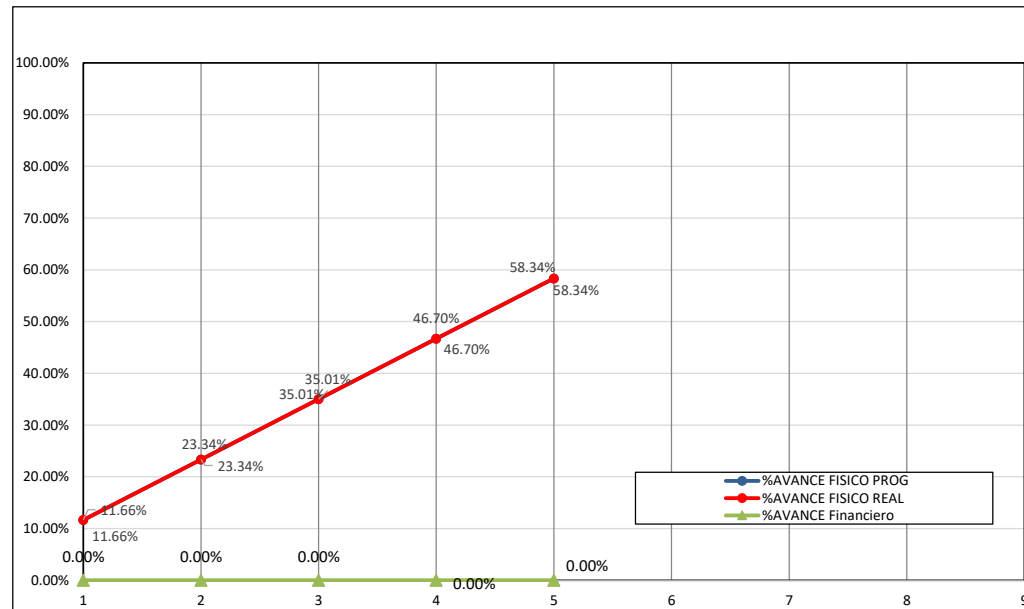

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
