

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 H/2025 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 001 H/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: sábado, 17 de mayo de 2025

Días de Obra: 45

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: sábado, 17 de mayo de 2025

Monto Contratado: \$ 97,664.27


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: lunes, 30 de junio de 2025

Monto Ejercido: \$ 97,664.27

Fin Real: lunes, 30 de junio de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/05/2025	33.95%	33.95%	0.00%
2	31/05/2025	47.77%	47.77%	0.00%
3	07/06/2025	57.87%	57.87%	57.87%
4	14/06/2025	70.69%	70.69%	57.87%
5	21/06/2025	83.51%	83.51%	57.87%
6	28/06/2025	96.34%	96.34%	57.87%
7	05/07/2025	100.00%	100.00%	100.00%
8	12/07/2025	100.00%	100.00%	100.00%

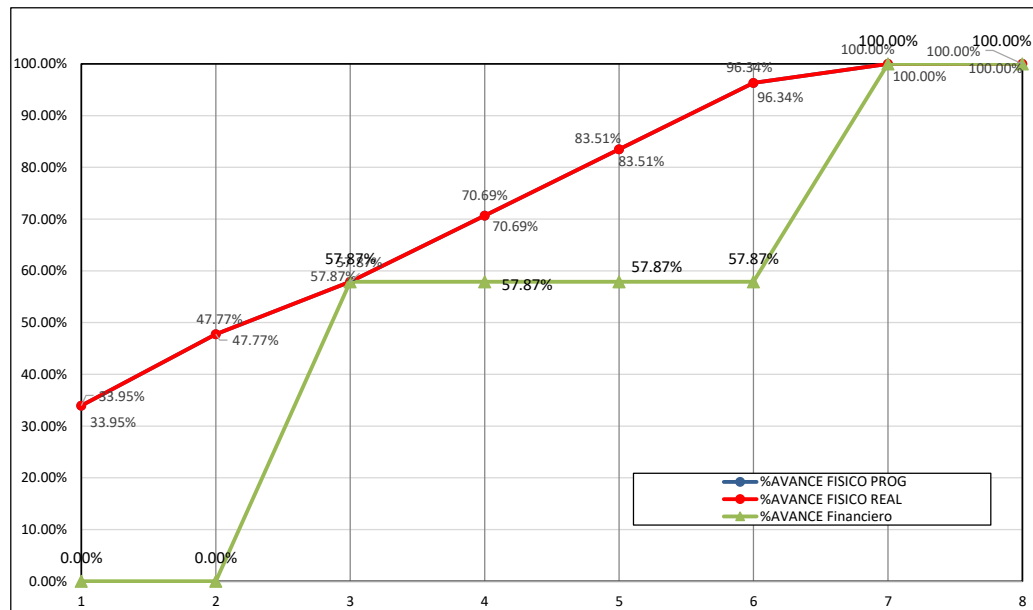

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
