


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001 K/2025 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 3 OBRAS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CONCEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA EN CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO)				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001 K/2025		
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ,		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 17 de junio de 2025	<b>Días de Obra:</b>	180
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	martes, 17 de junio de 2025	<b>Monto Contratado:</b>	\$ 225,243.00
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Fin Vigente:</b>	sábado, 13 de diciembre de 2025	<b>Monto Ejercido:</b>	
		<b>Fin Real:</b>	sábado, 13 de diciembre de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/06/2025	10.52%	10.52%	0.00%
2	17/07/2025			
3	16/08/2025			
4	15/09/2025			
5	15/10/2025			
6	14/11/2025			
7	14/12/2025			
8	13/01/2026			
9	12/02/2026			

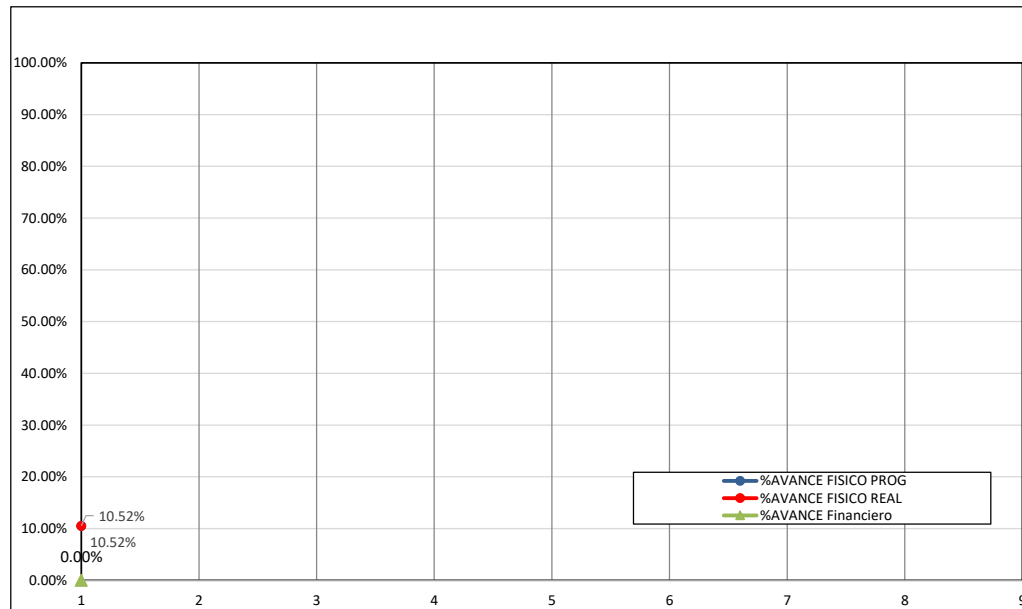

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
