


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 002/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE RIO SAN PEDRO; REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS ALUMBRADO				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 002/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ,		
Programa:	SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente:	viernes, 9 de mayo de 2025	Días de Obra:	120
Subprograma:	01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	Inicio Real:	viernes, 9 de mayo de 2025	Monto Contratado:	\$ 11,529,671.83
Residente:	ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES	Fin Vigente:	viernes, 5 de septiembre de 2025	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	viernes, 5 de septiembre de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/05/2025	1.08%	1.23%	50.00%
2	21/05/2025	2.86%	2.95%	50.00%
3	28/05/2025	5.82%	6.23%	50.00%
4	04/06/2025	9.38%	9.43%	50.00%
5	11/06/2025	12.32%	12.91%	50.00%
6	18/06/2025	14.55%	15.63%	50.00%
7	25/06/2025	15.14%	15.89%	50.00%
8	02/07/2025	20.89%		
9	09/07/2025	29.69%		
10	16/07/2025	39.44%		
11	23/07/2025	49.18%		
12	30/07/2025	58.93%		
13	06/08/2025	68.67%		
14	13/08/2025	78.57%		
15	20/08/2025	88.47%		
16	27/08/2025	98.37%		
17	03/09/2025	99.56%		
18	10/09/2025	100.00%		

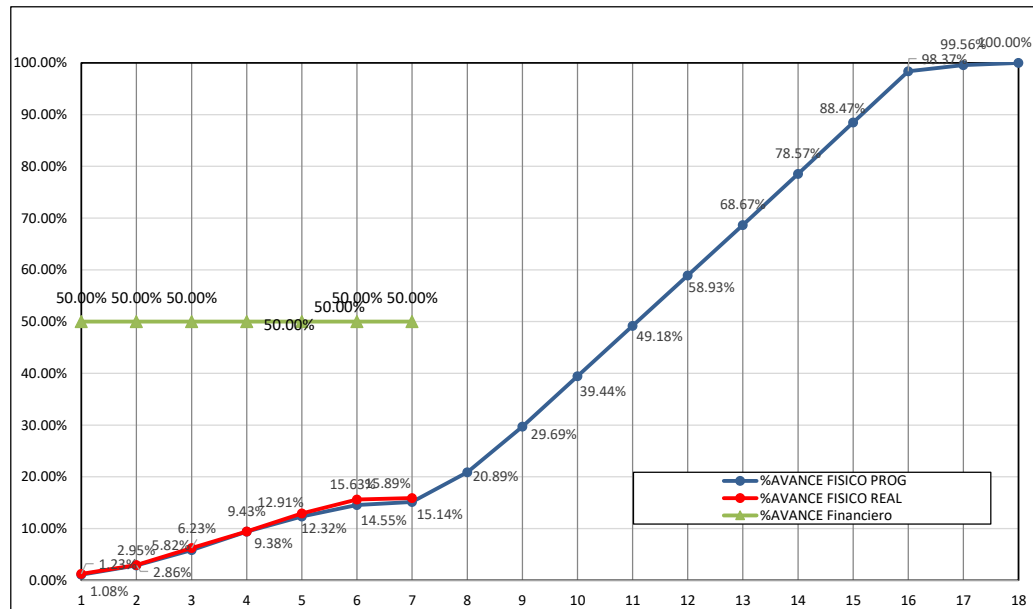

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
