

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 003/2025 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE TRAMO PROL. 24 DE DICIEMBRE A AV. CONSTITUCIÓN
 PF24 004/2025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR, TRAMO OJO DE AGUA DE MEZQUITE A CALLE LORETTITO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF24 003 004/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 20 de junio de 2025

Días de Obra: 90

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: viernes, 20 de junio de 2025

Monto Contratado: \$3,665,057.97


Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO

Fin Vigente: miércoles, 17 de septiembre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 17 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2025	1.10%	1.20%	50.00%
2	01/07/2025			
3	08/07/2025			
4	15/07/2025			
5	22/07/2025			
6	29/07/2025			
7	05/08/2025			
8	12/08/2025			
9	19/08/2025			

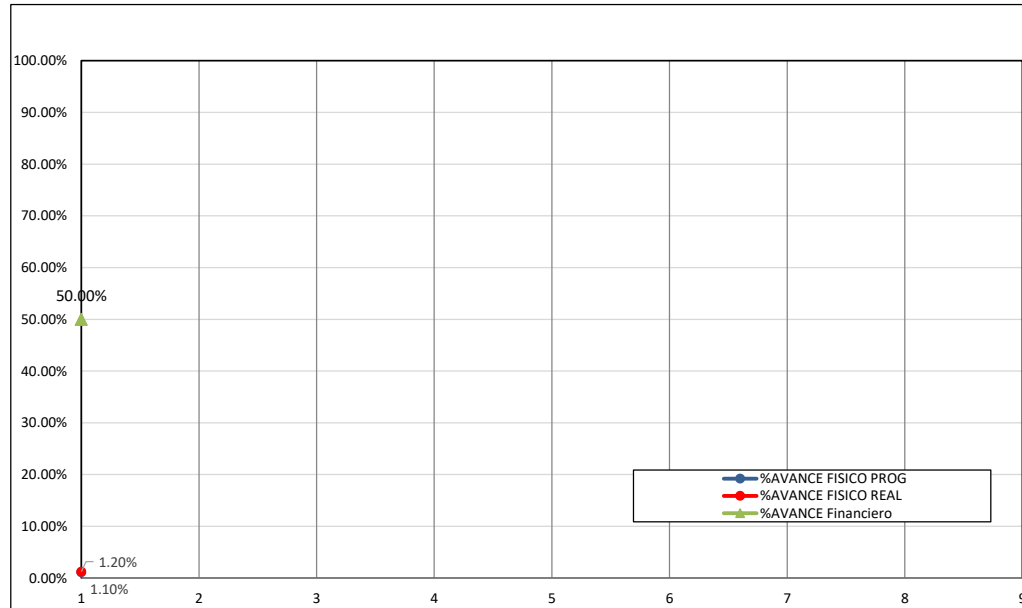

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
