

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 001/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SENALETICA; Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 12 DE DICIEMBRE A LIB. LUIS MOYA.  
 FAISMUN 003/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SAUCE, TRAMO DE AV. JUAREZ A CALLE GUAYABITOS.

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** FAISMUN 001 003/2025

**Tipo de inversión:** FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SE URBANIZACIÓN  
**Programa:** SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

**Contratista:** .CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.  
 .ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Inicio Vigente:** jueves, 10 de julio de 2025

**Días de Obra:** 120

**Subprograma:** 01,03,05 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO  
**Residente:** ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

**Inicio Real:** jueves, 10 de julio de 2025


**Monto Contratado:** \$15,513,851.00

**Fin Vigente:** jueves, 6 de noviembre de 2025

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** jueves, 6 de noviembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/07/2025	12.64%	13.15%	50.00%
2	15/08/2025	41.71%	42.16%	59.15%
3	15/09/2025	74.56%	75.15%	62.13%
4	15/10/2025	97.59%		
5	14/11/2025	100.00%		
6	14/12/2025	100.00%		
7	13/01/2026	100.00%		
8	12/02/2026	100.00%		
9	14/03/2026	100.00%		

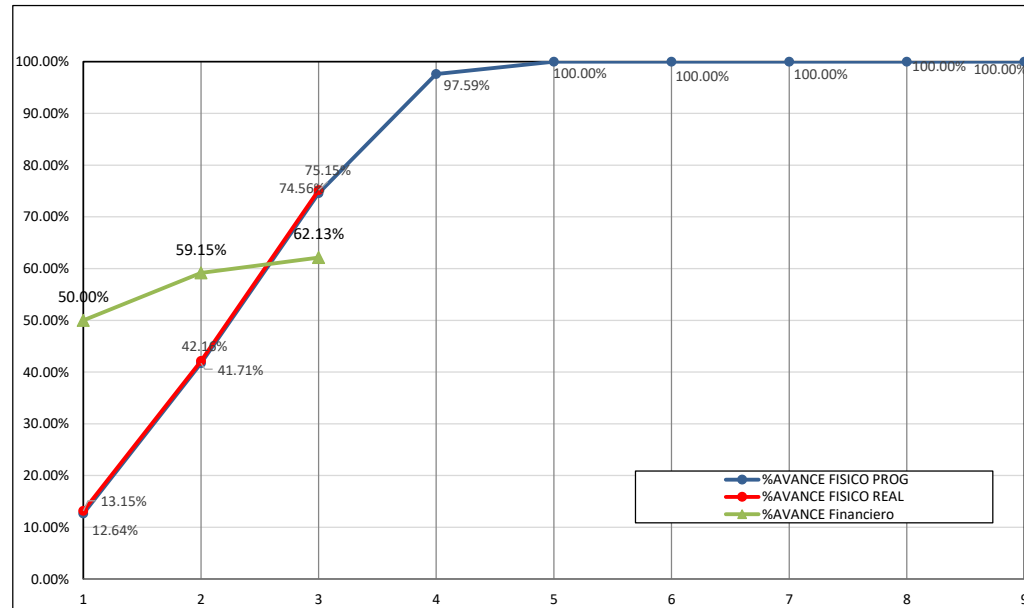

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO**
