


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 002/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PUBLICO Y CICLOVIA EN CALLE 24 DE FEBRERO TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 05 DE MAYO; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE FEBRERO TRAMO 1 DE MAYO A 5 DE MAYO

Ubicación: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SE URBANIZACIÓN
Programa: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
Subprograma: 01,03,05 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO
Residente: ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Contrato: FAISMUN 002/2025
Contratista: JORGE ADRIAN RESENDIZ RAMIREZ
Inicio Vigente: lunes, 14 de julio de 2025 **Días de Obra:** 90
Inicio Real: lunes, 14 de julio de 2025 **Monto Contratado:** \$5,720,285.09
Fin Vigente: sábado, 11 de octubre de 2025 **Monto Ejercido:**
Fin Real: sábado, 11 de octubre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/07/2025	0.58%	0.61%	50.00%
2	09/08/2025	5.27%	5.98%	50.00%
3	30/08/2025	25.95%	25.96%	62.63%
4	20/09/2025	83.31%	84.56%	70.13%
5	11/10/2025	100.00%		
6	01/11/2025	100.00%		
7	22/11/2025	100.00%		
8	13/12/2025	100.00%		
9	03/01/2026	100.00%		

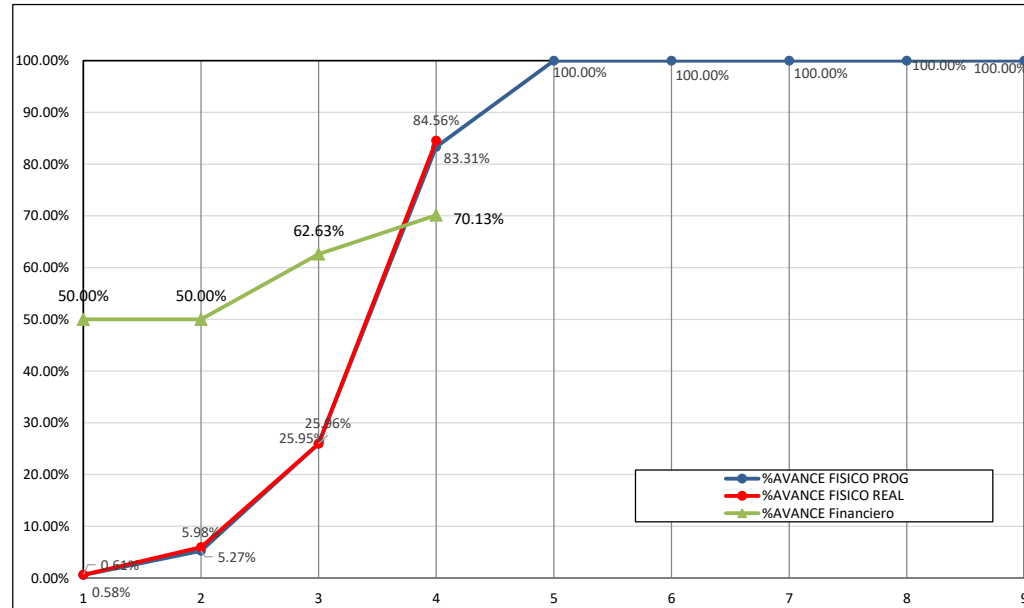

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
