

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 005/2025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALETICA; REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE LÓPEZ MATEOS

Ubicación: COL. MACARIO J. GÓMEZ, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FAISMUN 005/2025

Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO

Inicio Vigente: lunes, 14 de julio de 2025

Días de Obra: 90

Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO

Inicio Real: lunes, 14 de julio de 2025

Monto Contratado: \$3,742,009.65


Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Fin Vigente: sábado, 11 de octubre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: sábado, 11 de octubre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/07/2025	17.62%	18.26%	50.00%
2	30/08/2025	31.59%	32.59%	50.00%
3	30/09/2025	81.01%	82.26%	61.59%
4	31/10/2025	100.00%		
5	01/12/2025	100.00%		
6	01/01/2026	100.00%		
7	01/02/2026	100.00%		
8	04/03/2026	100.00%		
9	04/04/2026	100.00%		

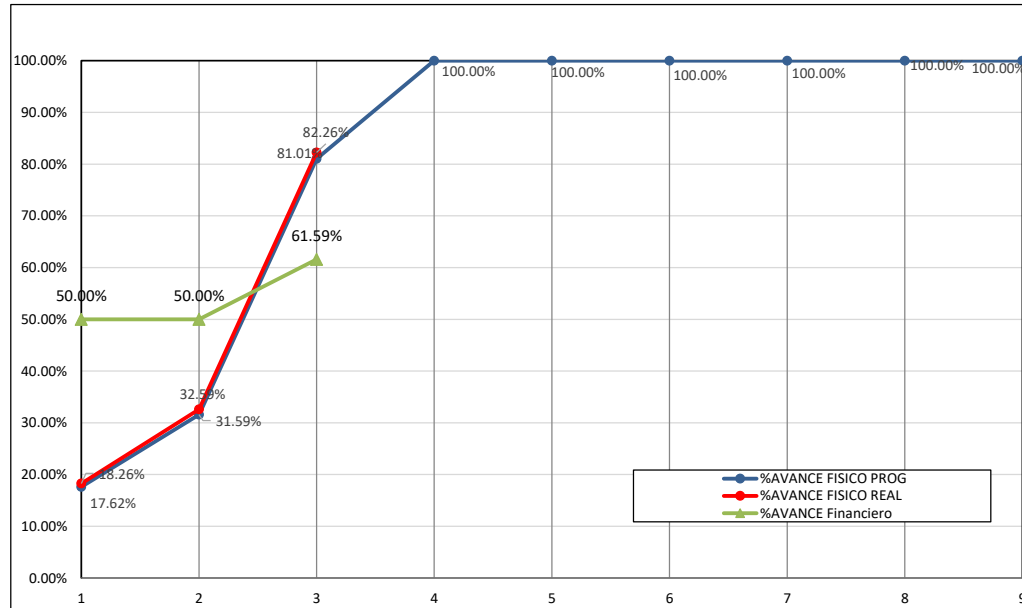

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
