

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FAISMUN 006/2025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, CONSUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALETICA, ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PARAISO DE CALLE SAUCE A LA CALLE PALMA.

**Ubicación:** FAISMUN 007/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; Y SEÑALETICA EN CALLE VIÑEDOS SAN FERNANDO DE AV. EXVIÑEDOS GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** FAISMUN 006 007/2025

**Tipo de inversión:** FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

**Contratista:** DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,

**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** miércoles, 16 de julio de 2025      **Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO


**Inicio Real:** miércoles, 16 de julio de 2025      **Monto Contratado:** \$5,296,226.28

**Residente:** ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES

**Fin Vigente:** sábado, 13 de septiembre de 2025      **Monto Ejercido:**

**Fin Real:** sábado, 13 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/07/2025	38.62%	40.15%	50.00%
2	30/08/2025	98.61%	99.02%	50.00%
3	30/09/2025	100.00%	100.00%	54.86%
4	31/10/2025	100.00%		
5	01/12/2025	100.00%		
6	01/01/2026	100.00%		
7	01/02/2026	100.00%		
8	04/03/2026	100.00%		
9	04/04/2026	100.00%		

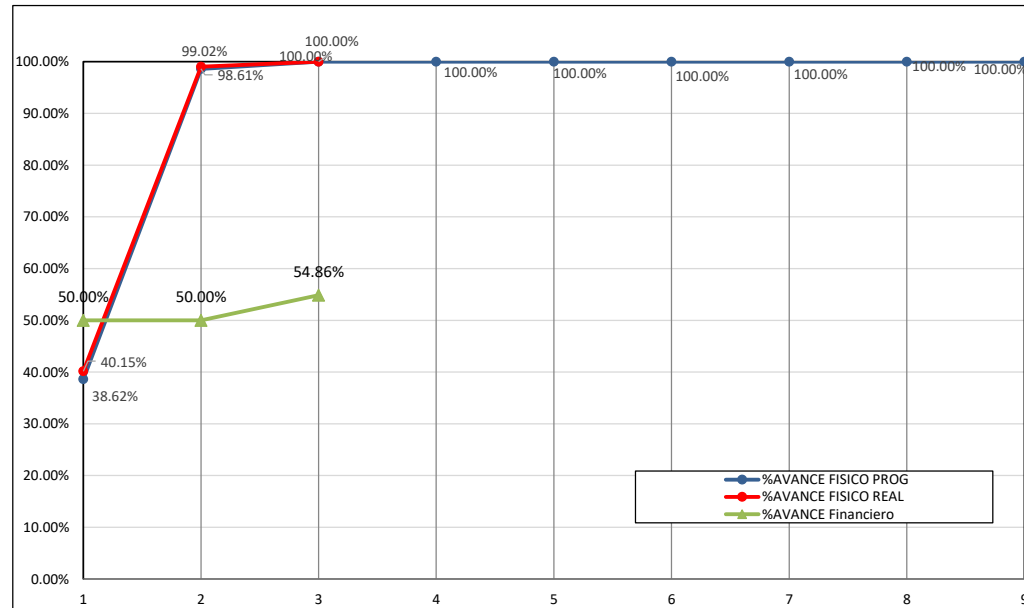

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO**
