

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FORTAMUN 001/2025 EDIFICIO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** FORTAMUN 001/2025

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2025)  
**Programa:** DA EDIFICIOS PÚBLICOS

**Contratista:** FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,

**Inicio Vigente:** viernes, 19 de septiembre de 2025

**Días de Obra:** 120

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCIÓN

**Inicio Real:** viernes, 19 de septiembre de 2025

**Monto Contratado:** \$5,655,401.29


**Residente:** ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

**Fin Vigente:** viernes, 16 de enero de 2026

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** viernes, 16 de enero de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2025	10.92%	11.02%	50.00%
2	30/10/2025	23.42%		
3	30/11/2025	55.70%		
4	30/12/2025	98.47%		
5	30/01/2026	100.00%		
6	28/02/2026	100.00%		
7	30/03/2026	100.00%		
8	30/04/2026	100.00%		
9	30/05/2026	100.00%		

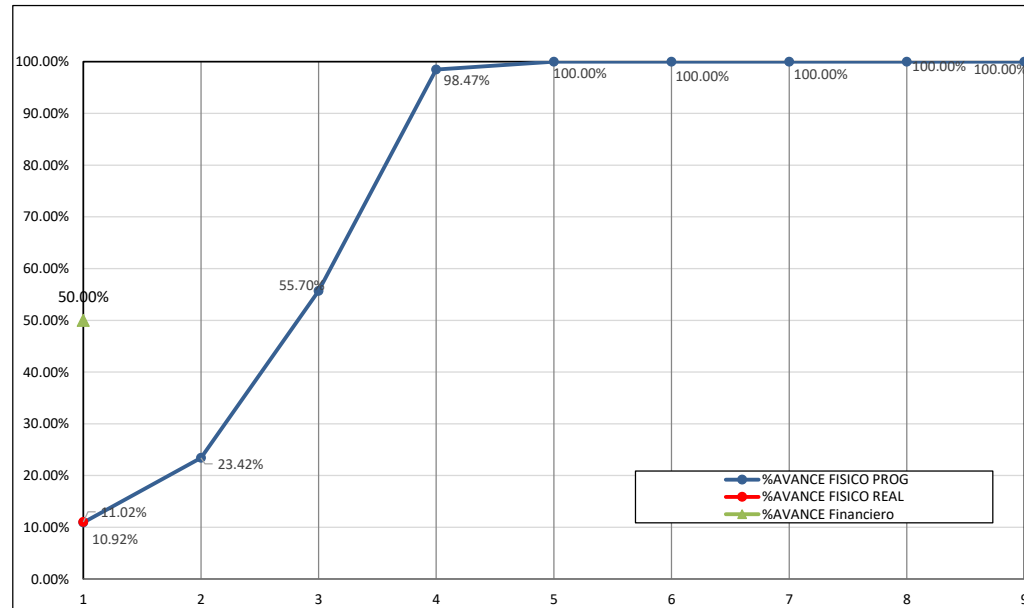

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO**
