


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP24 001/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PUBLICO Y CICLOVIA EN CALLE 21 DE MARZO TRAMO 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA 23 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP24 001/2025  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,  
**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** viernes, 20 de junio de 2025 **Días de Obra:** 90  
**Subprograma:** 01.03.05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO **Inicio Real:** viernes, 20 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$ 4,546,562.35  
**Residente:** ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO **Fin Vigente:** miércoles, 17 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** miércoles, 17 de septiembre de 2025

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 21/06/2025 | 3.10%               | 3.12%               | 50.00%             |
| 2      | 06/07/2025 | 17.78%              | 18.26%              | 50.00%             |
| 3      | 21/07/2025 | 34.44%              | 35.69%              | 55.19%             |
| 4      | 05/08/2025 | 51.11%              | 51.98%              | 55.19%             |
| 5      | 20/08/2025 | 67.78%              | 69.59%              | 68.98%             |
| 6      | 04/09/2025 | 84.44%              | 85.95%              | 68.98%             |
| 7      | 19/09/2025 | 100.00%             | 100.00%             | 87.26%             |
| 8      | 04/10/2025 | 100.00%             |                     |                    |
| 9      | 19/10/2025 | 100.00%             |                     |                    |
| 10     | 03/11/2025 | 100.00%             |                     |                    |
| 11     | 18/11/2025 | 100.00%             |                     |                    |
| 12     | 03/12/2025 | 100.00%             |                     |                    |

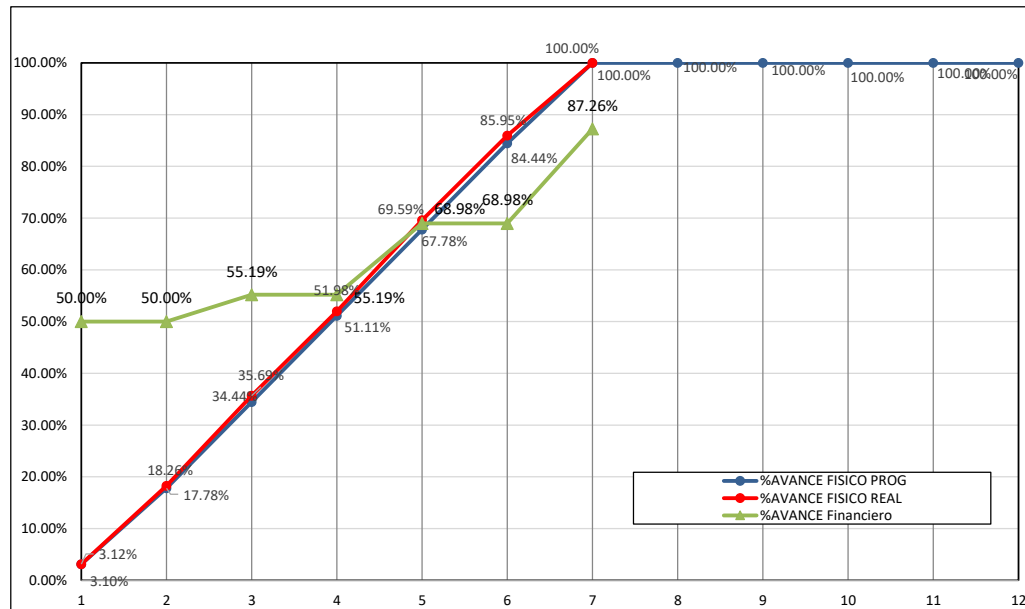

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
