

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP24 002/2025 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA 28 DE ABRIL.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP24 002/2025

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 SE URBANIZACIÓN

Contratista: OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Programa: SE URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: viernes, 20 de junio de 2025

Días de Obra: 60

Subprograma: 07 PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS

Inicio Real: viernes, 20 de junio de 2025

Monto Contratado: \$2,472,433.94


Residente: ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

Fin Vigente: lunes, 18 de agosto de 2025

Monto Ejercido: \$ 2,472,433.94

Fin Real: lunes, 18 de agosto de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/06/2025	0.58%	0.63%	50.00%
2	27/06/2025	5.98%	6.01%	50.00%
3	04/07/2025	20.22%	20.12%	50.00%
4	11/07/2025	32.12%	32.03%	68.53%
5	18/07/2025	45.20%	44.96%	68.53%
6	25/07/2025	59.19%	58.85%	68.53%
7	01/08/2025	73.47%	73.34%	68.53%
8	08/08/2025	86.48%	86.54%	79.42%
9	15/08/2025	99.48%	99.45%	79.42%
10	22/08/2025	100.00%	100.00%	79.42%
11	29/08/2025	100.00%	100.00%	99.01%
12	05/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%
13	12/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%
14	19/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%
15	26/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

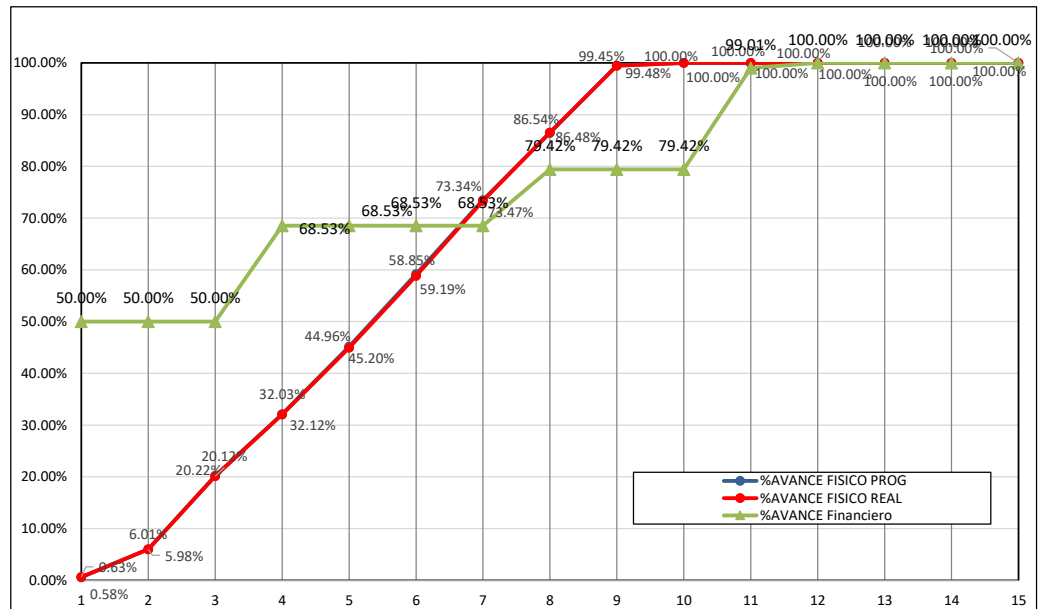

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
