


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP24 005/2025 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA TRAMO DE CALLE VILLA DEL CARBON A CALLE VILLA VERMOSA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP24 005/2025  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** miércoles, 25 de junio de 2025 **Días de Obra:** 75  
**Subprograma:** 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y RANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO **Inicio Real:** miércoles, 25 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$3,032,622.44  
**Residente:** ING. JUAN BELMARES VENTURA **Fin Vigente:** domingo, 7 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** domingo, 7 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/06/2025	2.99%	3.01%	50.00%
2	06/07/2025	6.62%	6.72%	50.00%
3	13/07/2025	13.13%	13.56%	50.00%
4	20/07/2025	17.45%	17.69%	65.32%
5	27/07/2025	21.70%	22.01%	65.32%
6	03/08/2025	25.40%	26.61%	65.32%
7	10/08/2025	49.35%	50.01%	65.32%
8	17/08/2025	69.69%	69.79%	65.32%
9	24/08/2025	86.87%	86.88%	65.32%
10	31/08/2025	95.99%	96.53%	65.32%
11	07/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
12	14/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
13	21/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
14	28/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
15	05/10/2025	100.00%	100.00%	
16	12/10/2025	100.00%	100.00%	
17	19/10/2025	100.00%	100.00%	

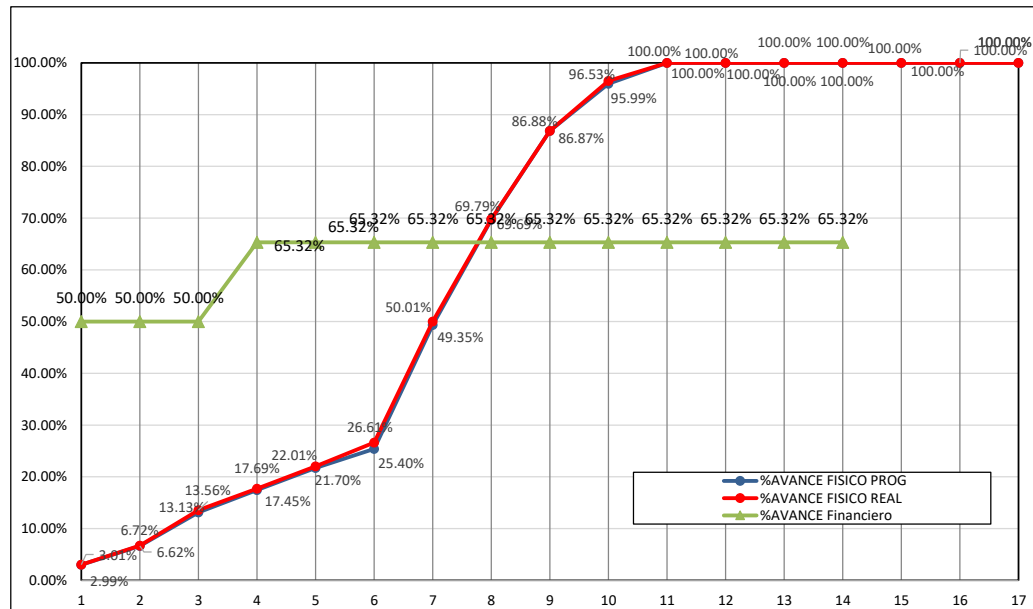

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
