

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP24 007/2025 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP24 007/2025

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Inicio Vigente: jueves, 10 de julio de 2025

Días de Obra: 90

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: jueves, 10 de julio de 2025

Monto Contratado: \$4,106,452.77


Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Fin Vigente: martes, 7 de octubre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: martes, 7 de octubre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/07/2025	19.54%	19.54%	52.29%
2	30/08/2025	51.29%	51.29%	57.82%
3	30/09/2025	93.59%	93.59%	57.82%
4	31/10/2025	100.00%		
5	01/12/2025	100.00%		
6	01/01/2026	100.00%		
7	01/02/2026	100.00%		
8	04/03/2026	100.00%		
9	04/04/2026	100.00%		

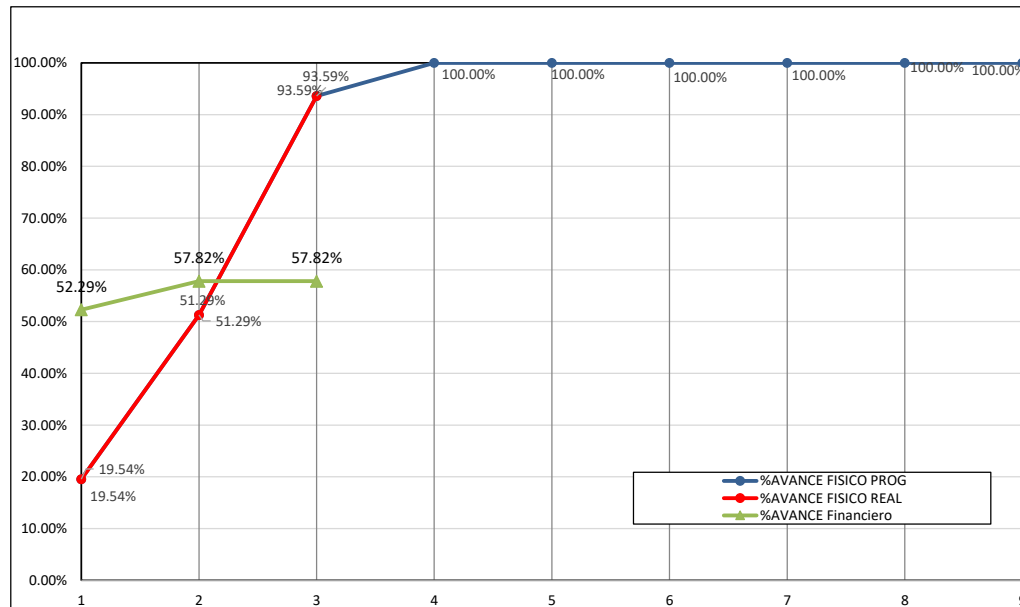

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
