


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 N/2025 ANTEPROYECTO, CONCEPTUAL, LOTIFICACIÓN Y TRAZO GEOMETRICO DE URBANIZACIÓN PARA PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,;				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 N/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	miércoles, 27 de agosto de 2025	Días de Obra:	180
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 27 de agosto de 2025	Monto Contratado:	\$ 416,920.12
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	domingo, 22 de febrero de 2026	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	domingo, 22 de febrero de 2026		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2025	9.73%	9.73%	0.00%
2	30/09/2025	32.55%	32.55%	0.00%
3	30/10/2025	70.96%		
4	30/11/2025	92.48%		
5	30/12/2025	94.71%		
6	30/01/2026	98.88%		
7	28/02/2026	100.00%		
8	30/03/2026	100.00%		
9	30/04/2026	100.00%		

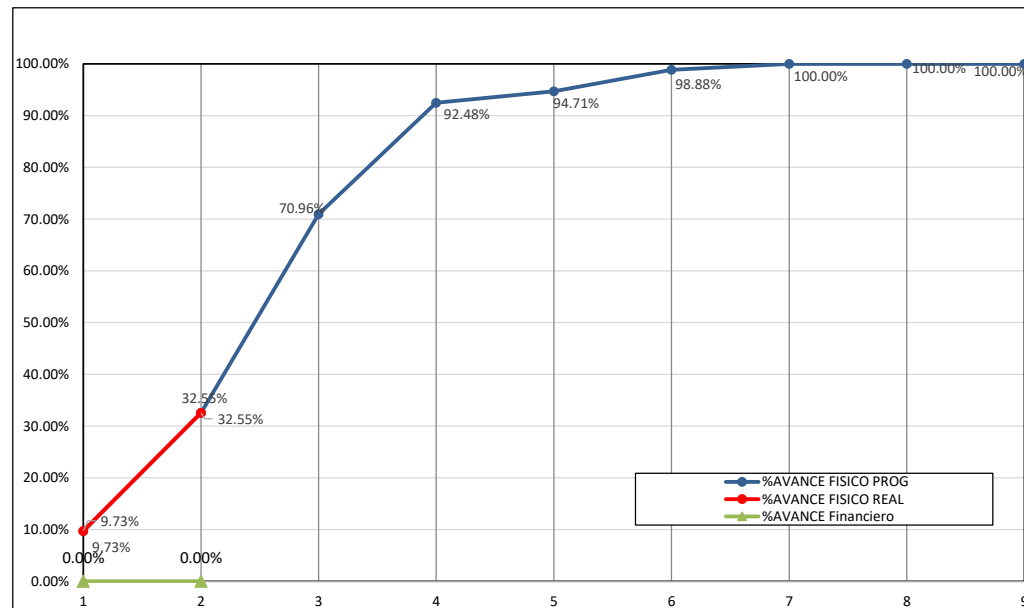

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
