


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001/2025 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE COLONIA 28 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,		
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 A/2025
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	martes, 25 de febrero de 2025
Subprograma:	03 SERVICIOS	Días de Obra:	21
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Inicio Real:	martes, 25 de febrero de 2025
		Monto Contratado:	\$ 117,757.40
		Fin Vigente:	lunes, 17 de marzo de 2025
		Monto Ejercido:	\$ 117,757.40
		Fin Real:	lunes, 17 de marzo de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/02/2025	30.09%	30.09%	0.00%
2	07/03/2025	84.88%	84.88%	0.00%
3	14/03/2025	93.05%	93.05%	0.00%
4	21/03/2025	100.00%	100.00%	100.00%

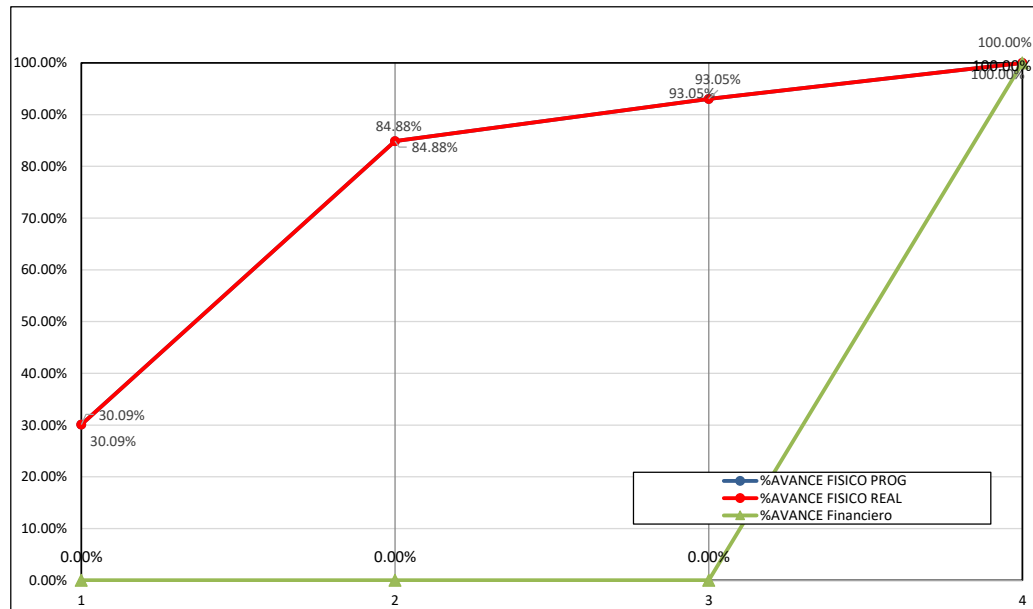

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
