


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001D/2025 TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS COMUNIDADES MACARIO J. GÓMEZ Y EX VIÑEDOS GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.;		
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001 D/2025
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 8 de abril de 2025
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Días de Obra:</b>	30
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Inicio Real:</b>	martes, 8 de abril de 2025
		<b>Fin Vigente:</b>	miércoles, 7 de mayo de 2025
		<b>Fin Real:</b>	miércoles, 7 de mayo de 2025
		<b>Monto Contratado:</b>	\$ 226,403.00
		<b>Monto Ejercido:</b>	\$ 226,403.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/04/2025	17.68%	17.68%	0.00%
2	19/04/2025	18.68%	18.68%	0.00%
3	26/04/2025	86.50%	86.50%	0.00%
4	03/05/2025	91.49%	91.49%	0.00%
5	10/05/2025	100.00%	100.00%	100.00%
6	17/05/2025	100.00%	100.00%	100.00%

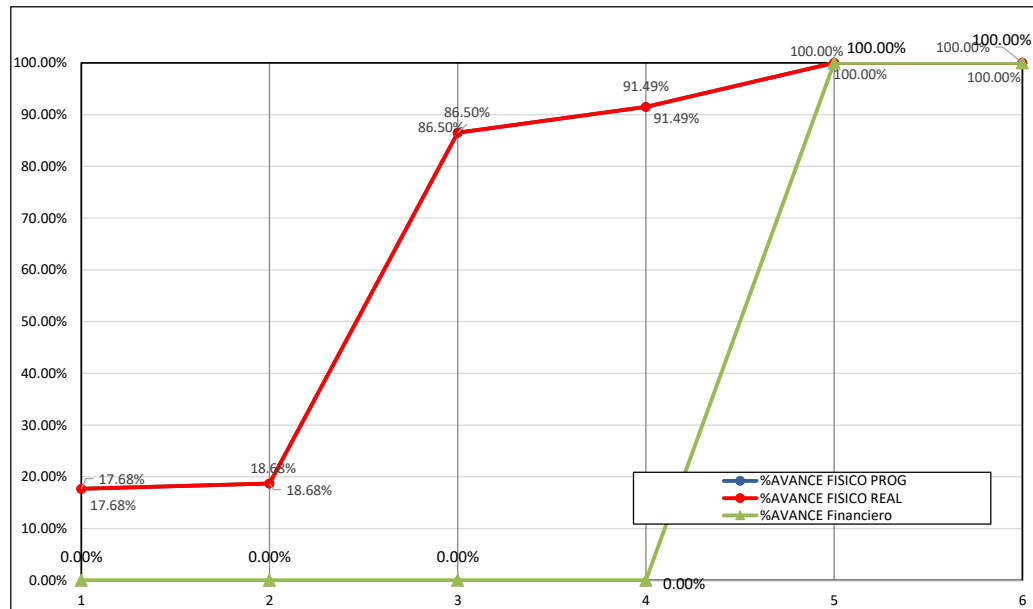

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
