


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001 E/2025 TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE AGUASCALIENTES Y LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.;		
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001 E/2025
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 29 de abril de 2025
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Días de Obra:</b>	21
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Inicio Real:</b>	martes, 29 de abril de 2025
		<b>Fin Vigente:</b>	lunes, 19 de mayo de 2025
		<b>Fin Real:</b>	lunes, 19 de mayo de 2025
		<b>Monto Contratado:</b>	\$ 99,481.21
		<b>Monto Ejercido:</b>	\$ 99,481.21

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/04/2025	11.60%	11.60%	0.00%
2	10/05/2025	69.29%	69.29%	0.00%
3	17/05/2025	91.72%	91.72%	0.00%
4	24/05/2025	100.00%	100.00%	100.00%

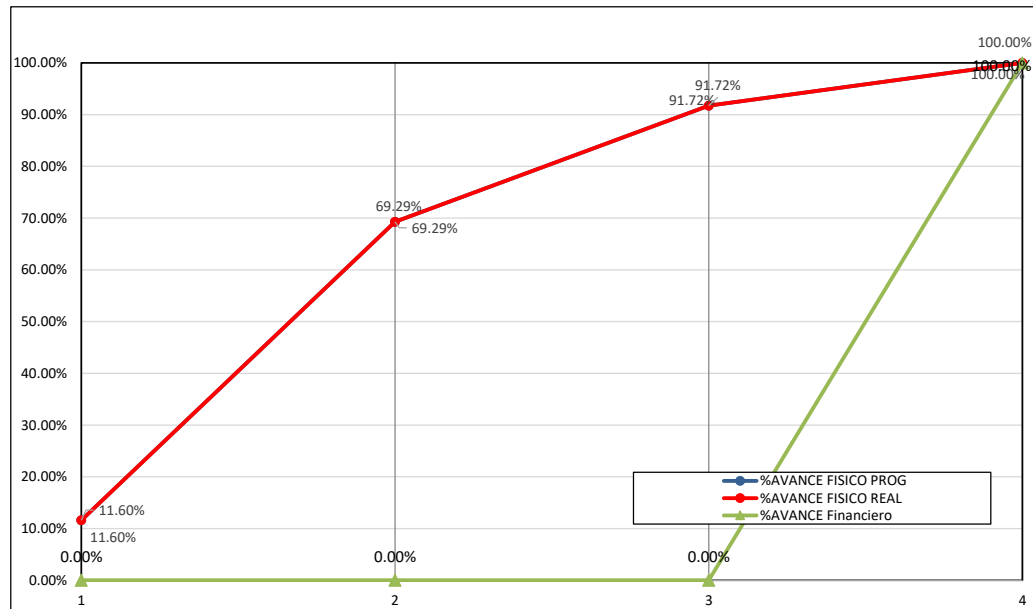

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
