


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 001 F/2025 PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 001 F/2025  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ TOLEDO  
**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** sábado, 24 de mayo de 2025 **Días de Obra:** 60  
**Subprograma:** 03 SERVICIOS **Inicio Real:** sábado, 24 de mayo de 2025 **Monto Contratado:** \$ 109,662.08  
**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** martes, 22 de julio de 2025 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** martes, 22 de julio de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2025	11.66%	11.66%	0.00%
2	07/06/2025	23.34%	23.34%	0.00%
3	14/06/2025	35.01%	35.01%	0.00%
4	21/06/2025	46.70%	46.70%	0.00%
5	28/06/2025	58.34%	58.34%	0.00%
6	05/07/2025	70.11%	70.11%	77.76%
7	12/07/2025	80.10%	80.10%	77.76%
8	19/07/2025	91.66%	91.66%	77.76%
9	26/07/2025	100.00%	100.00%	77.76%
10	02/08/2025	100.00%	100.00%	77.76%
11	09/08/2025	100.00%	100.00%	77.76%
12	16/08/2025	100.00%	100.00%	77.76%
13	23/08/2025	100.00%	100.00%	77.76%
14	30/08/2025	100.00%	100.00%	77.76%
15	06/09/2025	100.00%	100.00%	77.76%
16	13/09/2025	100.00%	100.00%	

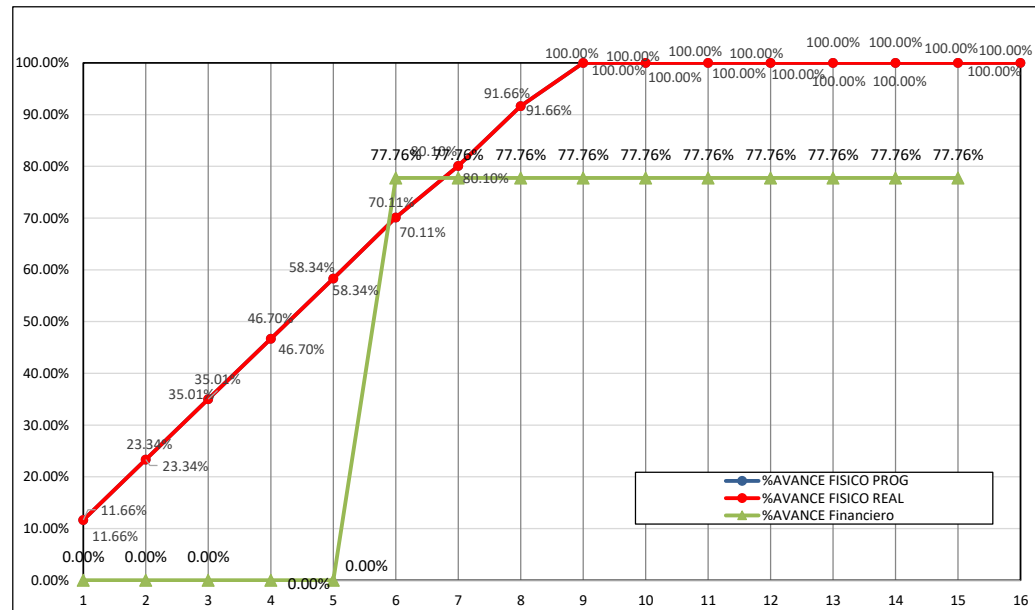

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
