


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001 G/2025 PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, CALLE LORETITO LADO ORIENTE Y CALLE VIÑEDOS RIBIER, PUERTECITO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001 G/2025		
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	SAGUE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	miércoles, 21 de mayo de 2025	<b>Días de Obra:</b>	60
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	miércoles, 21 de mayo de 2025	<b>Monto Contratado:</b>	\$ 141,487.22
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Fin Vigente:</b>	sábado, 19 de julio de 2025	<b>Monto Ejercido:</b>	
		<b>Fin Real:</b>	sábado, 19 de julio de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2025	11.47%	11.47%	0.00%
2	15/06/2025	30.09%	30.09%	0.00%
3	30/06/2025	47.74%	47.74%	0.00%
4	15/07/2025	93.00%	93.00%	0.00%
5	30/07/2025	100.00%	100.00%	0.00%
6	14/08/2025	100.00%	100.00%	0.00%
7	29/08/2025	100.00%	100.00%	0.00%
8	13/09/2025	100.00%	100.00%	
9	28/09/2025	100.00%	100.00%	

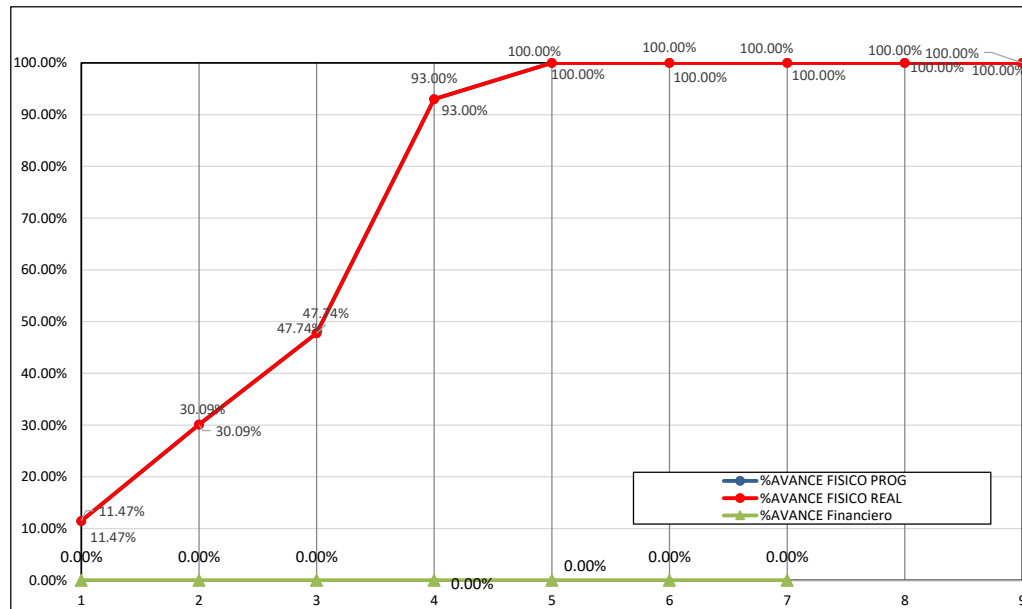

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
