


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 I/2025 PROYECTO EJECUTIVO DE LA REMODELACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 I/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	HULME ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	miércoles, 4 de junio de 2025	Días de Obra:	60
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 4 de junio de 2025	Monto Contratado:	\$ 280,799.80
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	sábado, 2 de agosto de 2025	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	sábado, 2 de agosto de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/06/2025	22.06%	22.06%	0.00%
2	04/07/2025	50.82%	50.82%	0.00%
3	19/07/2025	75.97%	75.97%	0.00%
4	03/08/2025	100.00%		
5	18/08/2025	100.00%		
6	02/09/2025	100.00%		
7	17/09/2025	100.00%		
8	02/10/2025	100.00%		
9	17/10/2025	100.00%		

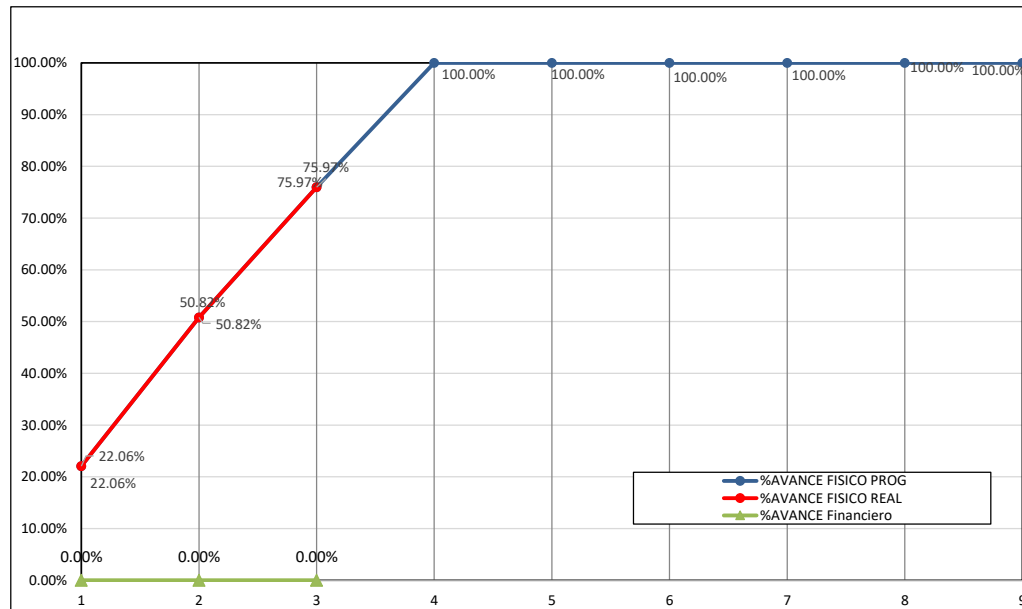

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
