


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 J/2025 ESTUDIO DE IMPACTO LUMINICO PARA CALLE PARAISO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y AV. SAUCE, FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS; CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CARRETERA A LIBRAMIENTO LUIS MOYA, COL. 28 DE ABRIL; CALLE 31 DE FEBRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, COL. 28 DE ABRIL; CALLE EMILIANO ZARATA ENTRE AV. BENITO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Ubicación: **Contrato:** PF 001J/2025
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** CR 18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** sábado, 12 de julio de 2025 **Días de Obra:** 15
Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** sábado, 12 de julio de 2025 **Monto Contratado:** \$ 120,127.79
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** sábado, 26 de julio de 2025 **Monto Ejercido:**
Fin Real: sábado, 26 de julio de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/07/2025	6.01%	6.01%	0.00%
2	26/07/2025	51.24%	51.24%	0.00%
3	02/08/2025	100.00%	100.00%	100.00%

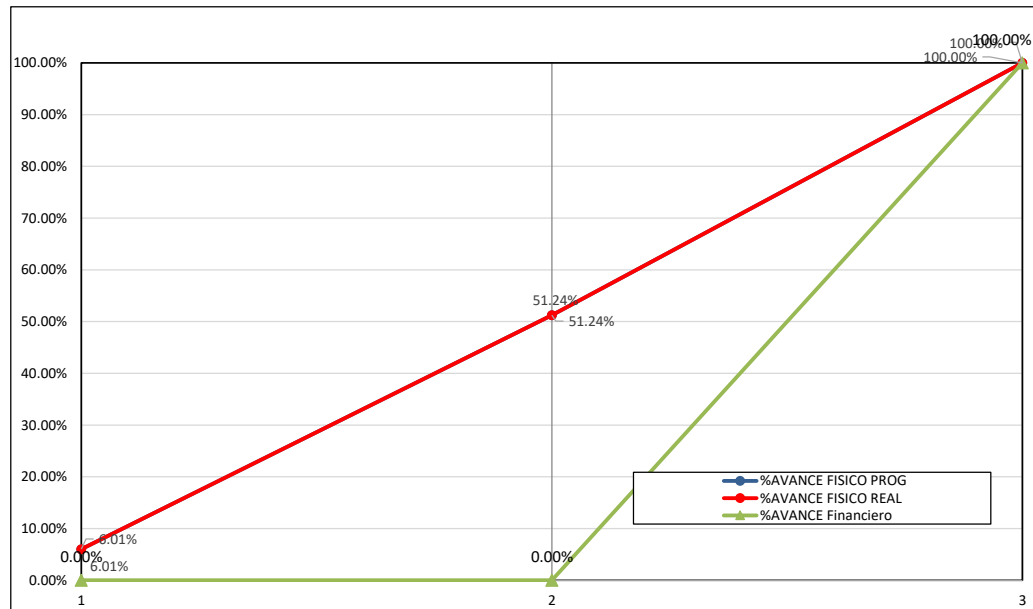

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
