


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 L/2025 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PROYECTO DE PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.;				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 L/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	miércoles, 27 de agosto de 2025	Días de Obra:	21
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 27 de agosto de 2025	Monto Contratado:	\$ 147,822.65
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	martes, 16 de septiembre de 2025	Monto Ejercido:	\$ 147,822.65
		Fin Real:	martes, 16 de septiembre de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2025	26.26%	26.26%	0.00%
2	06/09/2025	71.34%	71.34%	0.00%
3	13/09/2025	97.25%	97.25%	0.00%
4	20/09/2025	100.00%	100.00%	0.00%
5	27/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

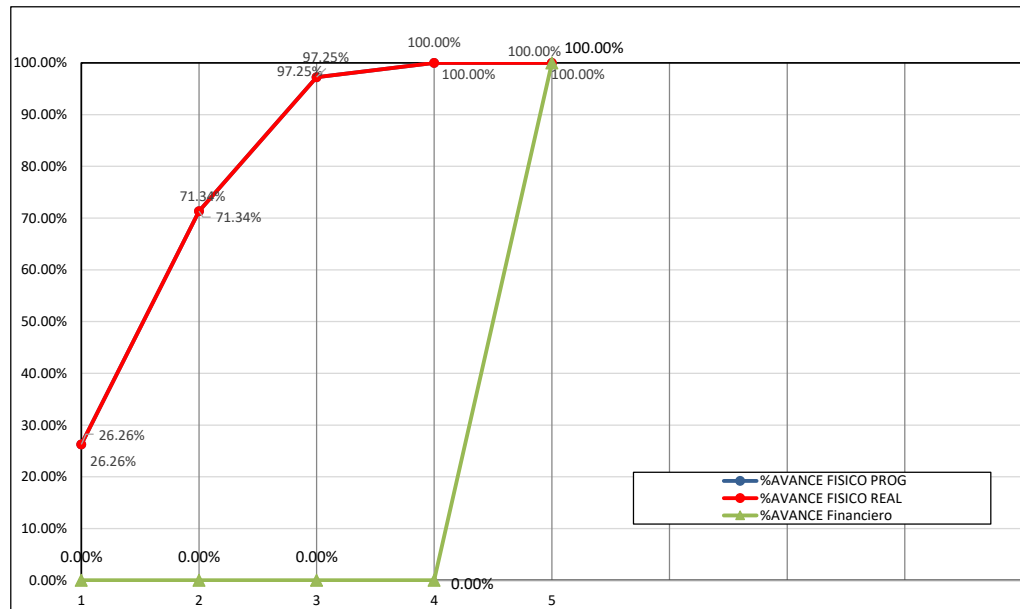

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
