

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 N/2025 ESTUDIOS GEOFÍSICO Y GEOLÓGICO PARA PROYECTO DE PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 001 N/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: GEOFISICA APLICADA A LA GEOTECNIA, S.C

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: miércoles, 10 de septiembre de 2025

Días de Obra: 60

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: miércoles, 10 de septiembre de 2025

Monto Contratado: \$ 66,070.54


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: sábado, 8 de noviembre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: sábado, 8 de noviembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/09/2025	49.99%	49.99%	0.00%
2	24/09/2025	51.89%	51.89%	0.00%
3	01/10/2025	53.78%		
4	08/10/2025	55.61%		
5	15/10/2025	57.57%		
6	22/10/2025	59.46%		
7	29/10/2025	85.22%		
8	05/11/2025	94.31%		
9	12/11/2025	100.00%		

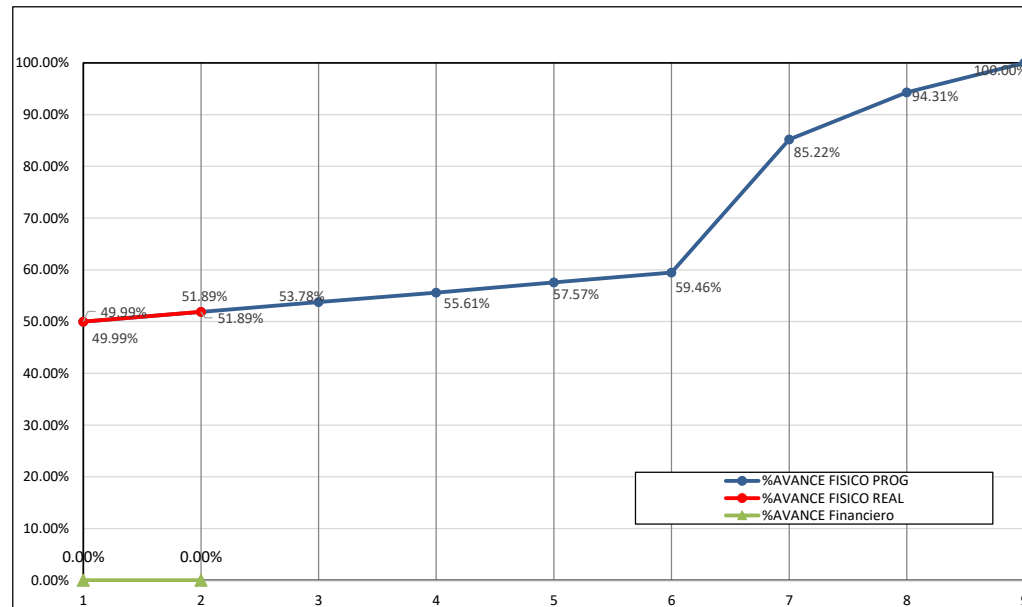

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
