


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 002/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE RIO SAN PEDRO; REHABILITACIÓN DE RED DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE JOSÉ MA. MORELOS; RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALIBRADO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 002/2025
Ubicación: **Contratista:** JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ,
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Inicio Vigente:** viernes, 9 de mayo de 2025 **Días de Obra:** 120
Programa: SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA **Inicio Real:** viernes, 9 de mayo de 2025 **Monto Contratado:** \$ 11,529,671.83
Subprograma: 01.03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Fin Vigente:** viernes, 5 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**
Residente: ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES **Fin Real:** viernes, 5 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/05/2025	1.08%	1.23%	50.00%
2	21/05/2025	2.86%	2.95%	58.26%
3	28/05/2025	5.82%	6.23%	58.26%
4	04/06/2025	9.38%	9.43%	58.26%
5	11/06/2025	12.32%	12.91%	58.26%
6	18/06/2025	14.55%	15.63%	63.35%
7	25/06/2025	15.14%	15.89%	63.35%
8	02/07/2025	20.89%	21.26%	63.35%
9	09/07/2025	29.69%	29.94%	63.35%
10	16/07/2025	39.44%	40.11%	76.48%
11	23/07/2025	49.18%	49.85%	76.48%
12	30/07/2025	58.93%	60.12%	76.48%
13	06/08/2025	68.67%	69.59%	76.48%
14	13/08/2025	78.57%	79.15%	76.48%
15	20/08/2025	88.47%	88.98%	76.48%
16	27/08/2025	98.37%	99.12%	76.48%
17	03/09/2025	99.56%	99.69%	92.92%
18	10/09/2025	100.00%	100.00%	92.92%
19	17/09/2025	100.00%	100.00%	92.92%
20	24/09/2025	100.00%	100.00%	92.92%
21	01/10/2025	100.00%	100.00%	

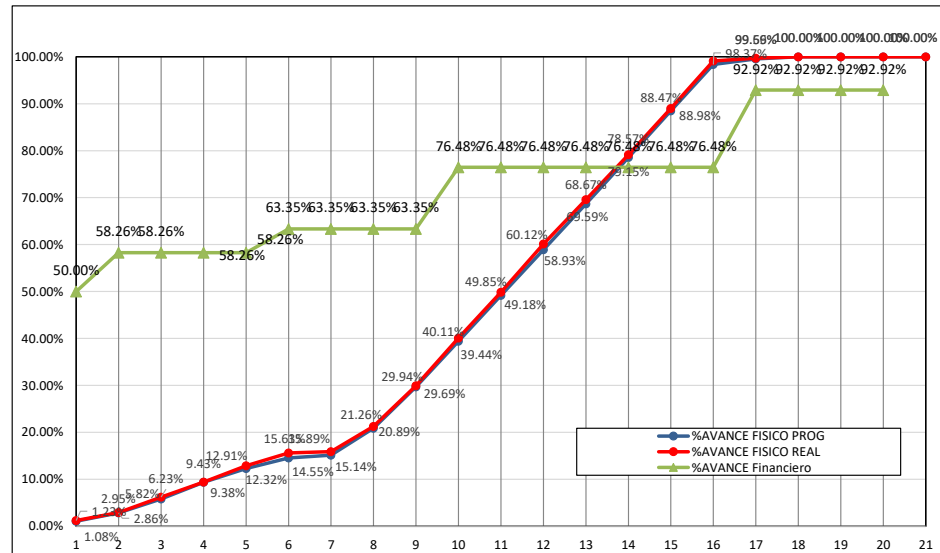

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
