


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 003/2025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE FCO. VILLA, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 002/2025
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ,
Programa: SD ALCANTARILLADO **Inicio Vigente:** viernes, 20 de junio de 2025 **Días de Obra:** 15
Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN **Inicio Real:** viernes, 20 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$ 902,813.52
Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO **Fin Vigente:** viernes, 4 de julio de 2025 **Monto Ejercido:**
Fin Real: viernes, 4 de julio de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2025	22.62%	23.16%	50.00%
2	01/07/2025	87.74%	88.96%	50.00%
3	08/07/2025	100.00%	100.00%	50.00%
4	15/07/2025	100.00%	100.00%	67.77%
5	22/07/2025	100.00%	100.00%	90.96%
6	29/07/2025	100.00%	100.00%	100.00%

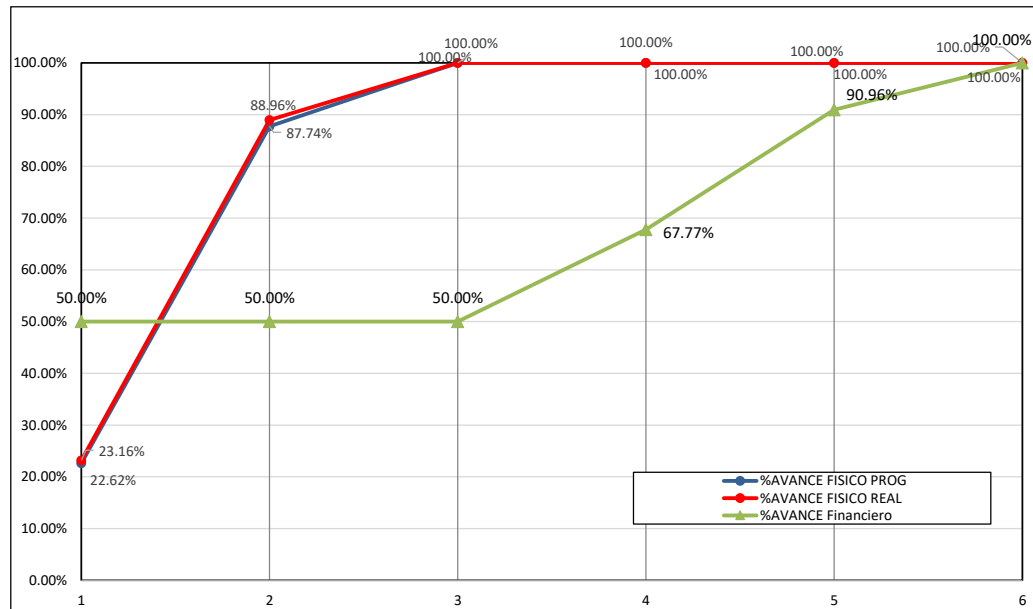

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
