

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 001/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ARTÍCULO 27
 PF24 002/2025 REGENERACIÓN DE CRUCEROS PEATONALES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF24 001 002/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. (ASOCIANTE)
 JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (ASOCIADO)


Programa: SE URBANIZACIÓN, SF PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** miércoles, 2 de julio de 2025 **Días de Obra:** 90

Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y RANQUETAS ALUMBRADO PUBLICO **Inicio Real:** miércoles, 2 de julio de 2025 **Monto Contratado:** \$9,893,123.91

Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO **Fin Vigente:** lunes, 29 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 29 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/07/2025	9.21%	10.25%	50.00%
2	29/08/2025	66.12%	67.58%	62.53%
3	29/09/2025	97.14%	97.96%	71.26%
4	29/10/2025	100.00%		
5	29/11/2025	100.00%		
6	29/12/2025	100.00%		
7	29/01/2026	100.00%		
8	27/02/2026	100.00%		
9	29/03/2026	100.00%		

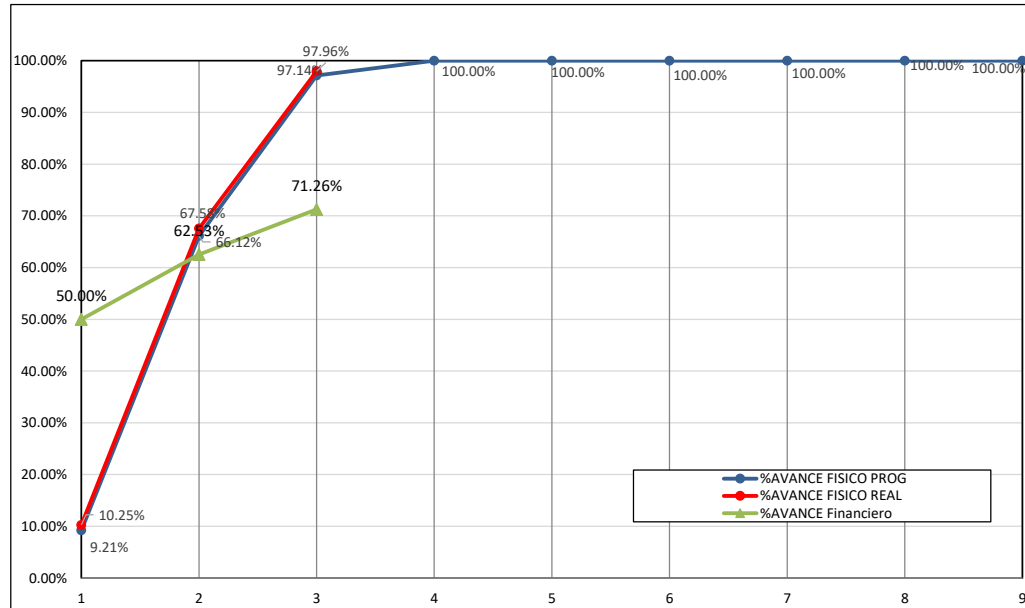

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
