

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 003/2025 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE TRAMO PROL. 24 DE DICIEMBRE A AV. CONSTITUCIÓN
 PF24 004/2025 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR, TRAMO OJO DE AGUA DE MEZQUITE A CALLE LORETTITO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF24 003 004/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 20 de junio de 2025

Días de Obra: 90

Subprograma: 03 CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: viernes, 20 de junio de 2025

Monto Contratado: \$3,694,461.76


Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO

Fin Vigente: miércoles, 17 de septiembre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 17 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/07/2025	23.87%	24.25%	49.60%
2	15/08/2025	74.73%	75.12%	61.12%
3	15/09/2025	95.66%	95.97%	72.59%
4	15/10/2025	100.00%		
5	14/11/2025	100.00%		
6	14/12/2025	100.00%		
7	13/01/2026	100.00%		
8	30/01/1900	100.00%		
9	30/01/1900	100.00%		

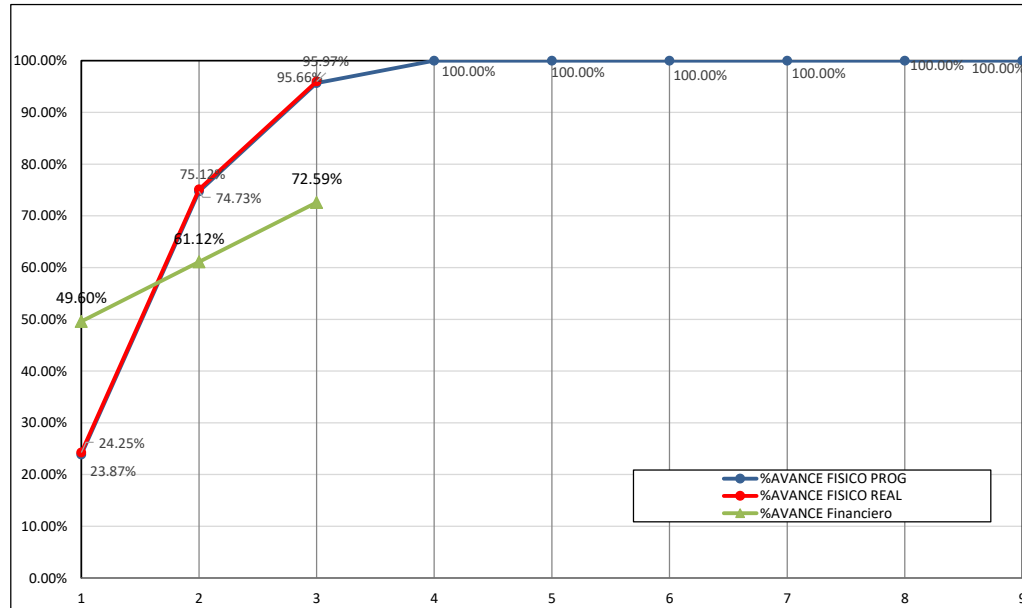

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
