

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 001/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SENALETICA; Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 12 DE DICIEMBRE A LIB. LUIS MOYA.
 FAISMUN 003/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SAUCE, TRAMO DE AV. JUAREZ A CALLE GUAYABITOS.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FAISMUN 001 003/2025

Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SE URBANIZACIÓN
Programa: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Contratista: .CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.
 .ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: jueves, 10 de julio de 2025

Días de Obra: 120

Subprograma: 01,03,05 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO
Residente: ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Inicio Real: jueves, 10 de julio de 2025

Monto Contratado: \$15,513,851.00


Fin Vigente: jueves, 6 de noviembre de 2025

Monto Ejercido: \$13,326,662.77

Fin Real: jueves, 6 de noviembre de 2025

Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/07/2025	12.64%	14.07%	58.21%
2	15/08/2025	41.71%	44.07%	62.09%
3	15/09/2025	74.56%	78.97%	78.52%
4	15/10/2025	97.59%	98.79%	89.20%
5	14/11/2025	100.00%	100.00%	89.20%
6	14/12/2025	100.00%	100.00%	100.00%

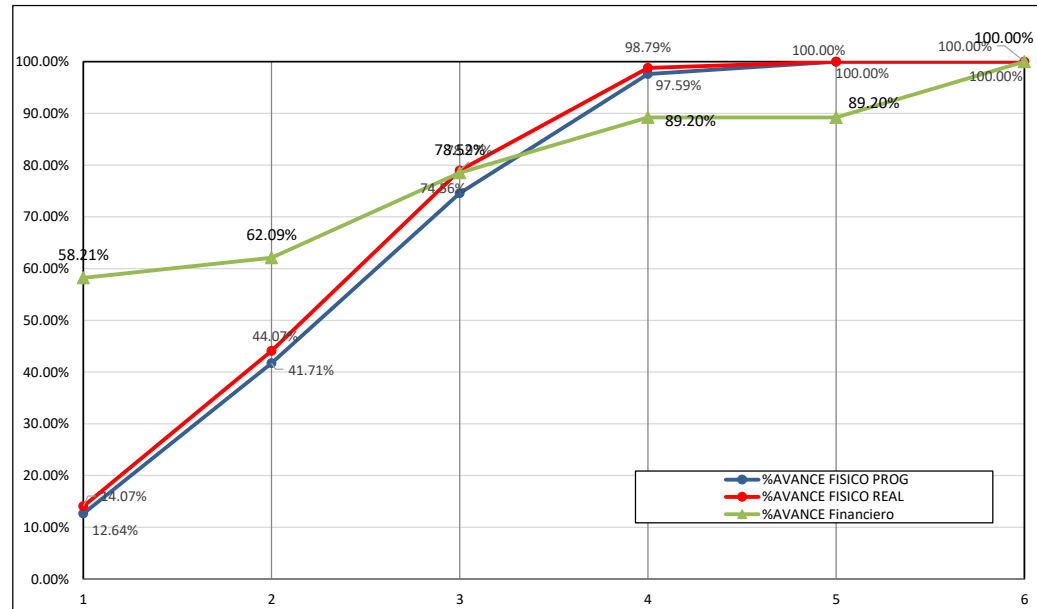

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
