


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 002/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PUBLICO Y CICLOVIA EN CALLE 24 DE FEBRERO TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 05 DE MAYO; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 24 DE FEBRERO TRAMO 1 DE MAYO A 5 DE MAYO

Ubicación: COL. 28 DE ABRIL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SE URBANIZACIÓN
Programa: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
Subprograma: 01.03.05 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO
Residente: ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Contrato: FAISMUN 002/2025
Contratista: JORGE ADRIAN RESENDIZ RAMIREZ
Inicio Vigente: lunes, 14 de julio de 2025 **Días de Obra:** 90
Inicio Real: lunes, 14 de julio de 2025 **Monto Contratado:** \$5,720,285.09
Fin Vigente: sábado, 11 de octubre de 2025 **Monto Ejercido:** \$ 5,180,337.73
Fin Real: sábado, 11 de octubre de 2025
 Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/07/2025	0.58%	3.38%	50.00%
2	09/08/2025	5.27%	38.65%	50.00%
3	30/08/2025	25.95%	74.36%	62.63%
4	20/09/2025	83.31%	87.97%	70.13%
5	11/10/2025	100.00%	100.00%	70.13%
6	01/11/2025	100.00%	100.00%	100.00%

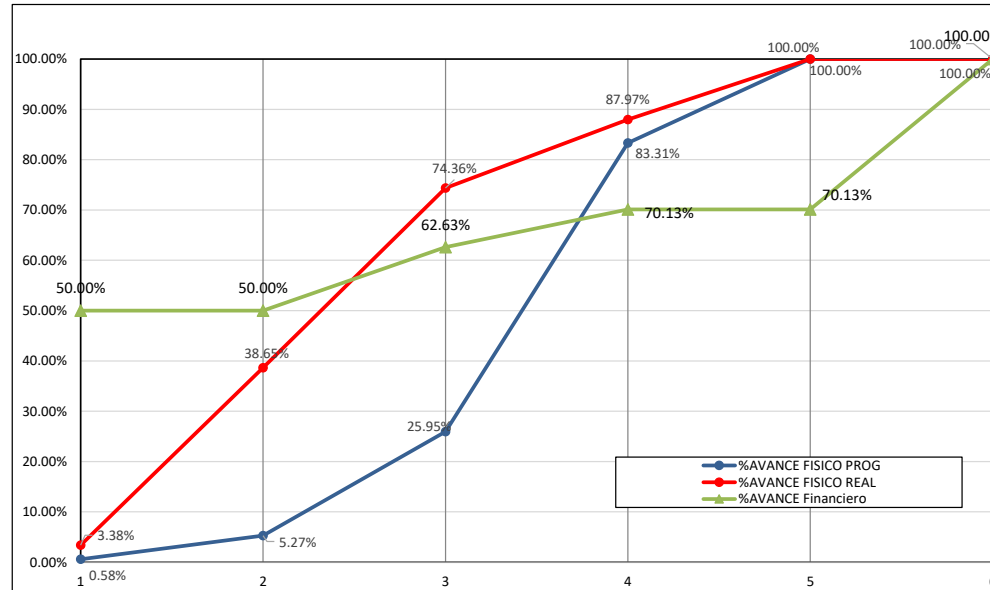

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
