


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 004/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BRASIL DE LA CALLE BOLIVIA A BELICE, FRACC. PANAMERICANO, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: FRACC. PANAMERICANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE
Programa: 01, 03b REHABILITACIÓN, CONCRETO, BANQUETAS
Subprograma: 01, 03b REHABILITACIÓN, CONCRETO, BANQUETAS
Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Contrato: FAISMUN 004/2025
Contratista: C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ
Inicio Vigente: jueves, 10 de julio de 2025 **Días de Obra:** 45
Inicio Real: jueves, 10 de julio de 2025 **Monto Contratado:** \$1,148,425.96
Fin Vigente: sábado, 23 de agosto de 2025 **Monto Ejercido:** \$1,148,425.96
Fin Real: sábado, 23 de agosto de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/07/2025	4.02%	21.07%	50.00%
2	19/07/2025	25.09%	42.51%	50.00%
3	26/07/2025	46.53%	59.92%	61.26%
4	02/08/2025	63.95%	64.30%	62.35%
5	09/08/2025	68.33%	73.54%	72.56%
6	16/08/2025	77.57%	95.97%	72.56%
7	23/08/2025	100.00%	100.00%	72.56%
8	30/08/2025	100.00%	100.00%	81.26%
9	06/09/2025	100.00%	100.00%	81.26%
10	13/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

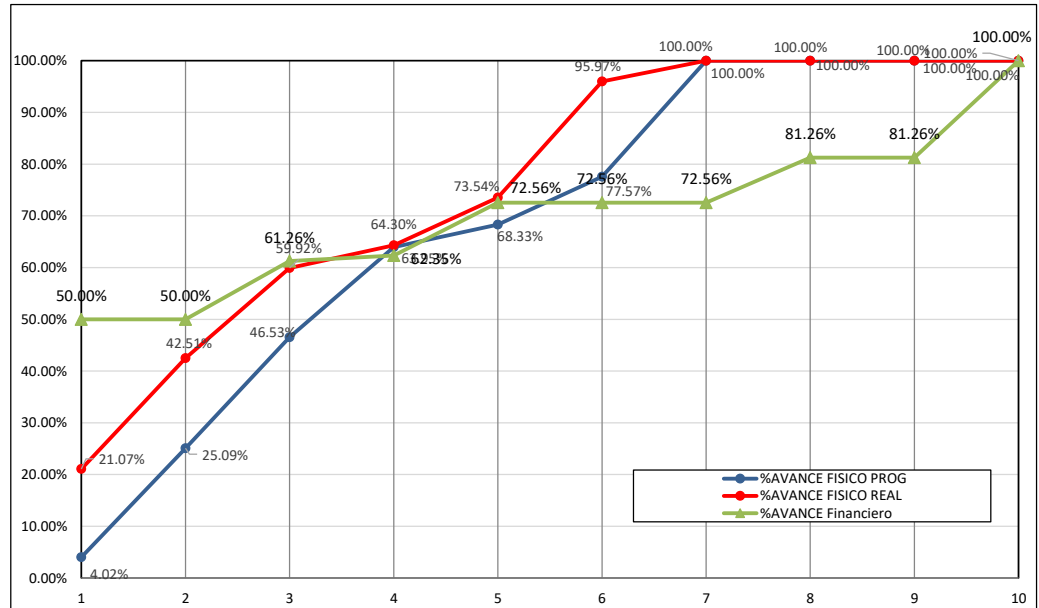

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
