


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 008/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PARAGUAY DE LA CALLE BRASIL A CALLE VENEZUELA
 FAISMUN 009/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROGRESO DE LA CALLE JUSTICIA A CALLE 5 DE MAYO
 FAISMUN 010/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE URUGUAY DE LA CALLE ARGENTINA A LA JOSÉ MA. CHÁVEZ

Ubicación:	FRACC. PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL COL SAN JOSE DEL BARRANCO Y COL. 28 DE ABRIL, EN	Contrato:	FAISMUN 008 009 010/2025
Tipo de inversión:	FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SD ALCANTARILLADO Y SC AGUA POTABLE	Contratista:	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.,
Programa:		Inicio Vigente:	viernes, 12 de diciembre de 2025
		Días de Obra:	60
Subprograma:	01 REHABILITACIÓN	Inicio Real:	viernes, 12 de diciembre de 2025
Residente:	ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES	Fin Vigente:	lunes, 9 de febrero de 2026
		Fin Real:	lunes, 9 de febrero de 2026
		Monto Contratado:	\$4,555,791.86
		Monto Ejercido:	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	27/12/2025	30.00%	31.12%	50.00%
2	26/01/2026			
3	26/02/2026			
4	29/03/2026			

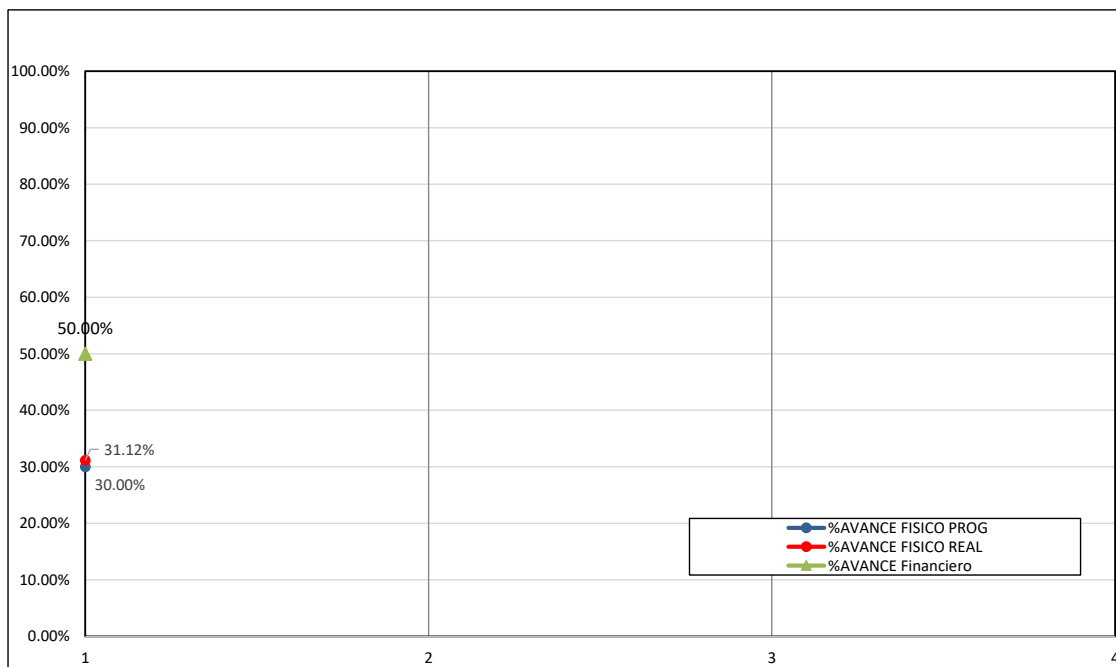

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
