

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 012/2025 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FAISMUN 012/2025

Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SH VIVIENDA DIGNA

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA

Inicio Vigente: viernes, 12 de diciembre de 2025

Días de Obra: 60

Residente: ARQ. JAIME ADAIR ESPINOSA MORA

Inicio Real: viernes, 12 de diciembre de 2025


Monto Contratado: \$4,657,931.43

Fin Vigente: lunes, 9 de febrero de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real: lunes, 9 de febrero de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	27/12/2025	32.15%	33.59%	50.00%
2	26/01/2026			
3	26/02/2026			
4	29/03/2026			

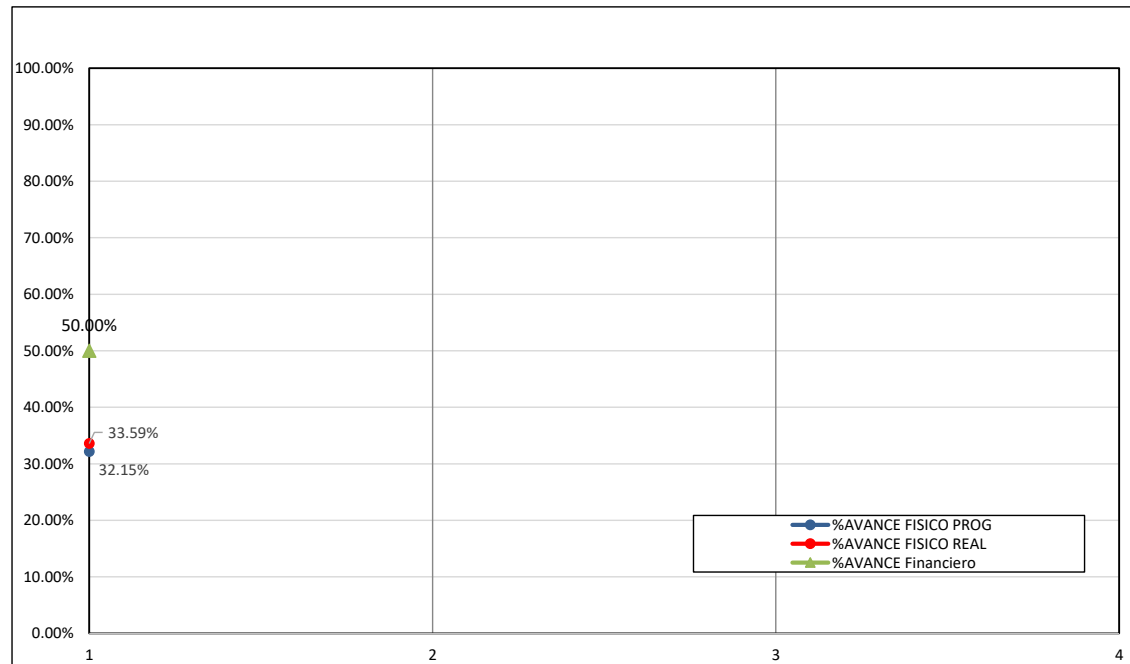

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
