


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP24 001/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y CICLOVIA EN CALLE 21 DE MARZO TRAMO 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE 05 DE MAYO, EN LA COLONIA 28 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP24 001/2025  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,  
**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA **Inicio Vigente:** viernes, 20 de junio de 2025 **Días de Obra:** 90  
**Subprograma:** 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO **Inicio Real:** viernes, 20 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$ 4,546,562.35  
**Residente:** ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO **Fin Vigente:** miércoles, 17 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:** \$ 4,120,722.32  
**Fin Real:** miércoles, 17 de septiembre de 2025 Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2025	3.17%	3.17%	50.00%
2	06/07/2025	14.03%	14.03%	50.00%
3	21/07/2025	18.52%	20.48%	55.19%
4	05/08/2025	29.48%	37.76%	55.19%
5	20/08/2025	62.44%	79.88%	68.98%
6	04/09/2025	96.08%	96.84%	68.98%
7	19/09/2025	100.00%	100.00%	87.26%
8	04/10/2025	100.00%	100.00%	87.26%
9	19/10/2025	100.00%	100.00%	100.00%

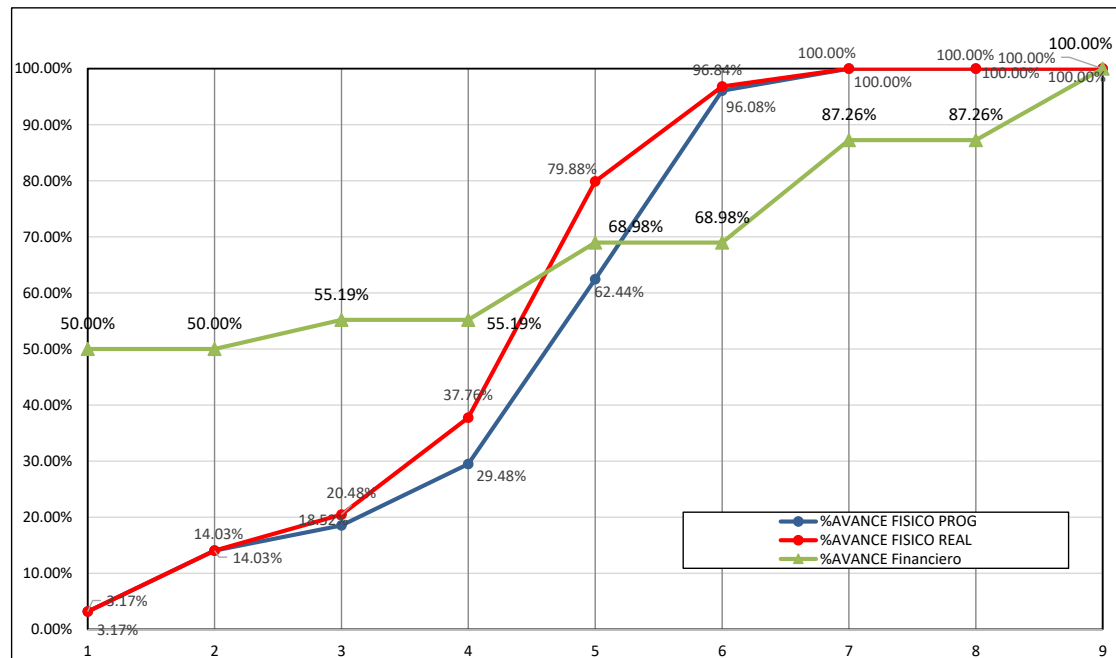

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
