


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP24 005/2025 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA TRAMO DE CALLE VILLA DEL CARBON A CALLE VILLA VERDE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** IP24 005/2025  
**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 **Contratista:** O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** miércoles, 25 de junio de 2025 **Días de Obra:** 75  
**Subprograma:** 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y RANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO **Inicio Real:** miércoles, 25 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$3,032,622.44  
**Residente:** ING. JUAN BELMARES VENTURA **Fin Vigente:** domingo, 7 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:** domingo, 7 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/06/2025	2.99%	5.05%	50.00%
2	06/07/2025	6.62%	10.75%	50.00%
3	13/07/2025	13.13%	17.22%	50.00%
4	20/07/2025	17.45%	22.29%	65.32%
5	27/07/2025	21.70%	27.37%	65.32%
6	03/08/2025	25.40%	33.68%	65.32%
7	10/08/2025	49.35%	52.31%	65.32%
8	17/08/2025	69.69%	68.06%	65.32%
9	24/08/2025	86.87%	83.17%	65.32%
10	31/08/2025	95.99%	98.93%	65.32%
11	07/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
12	14/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
13	21/09/2025	100.00%	100.00%	65.32%
14	28/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

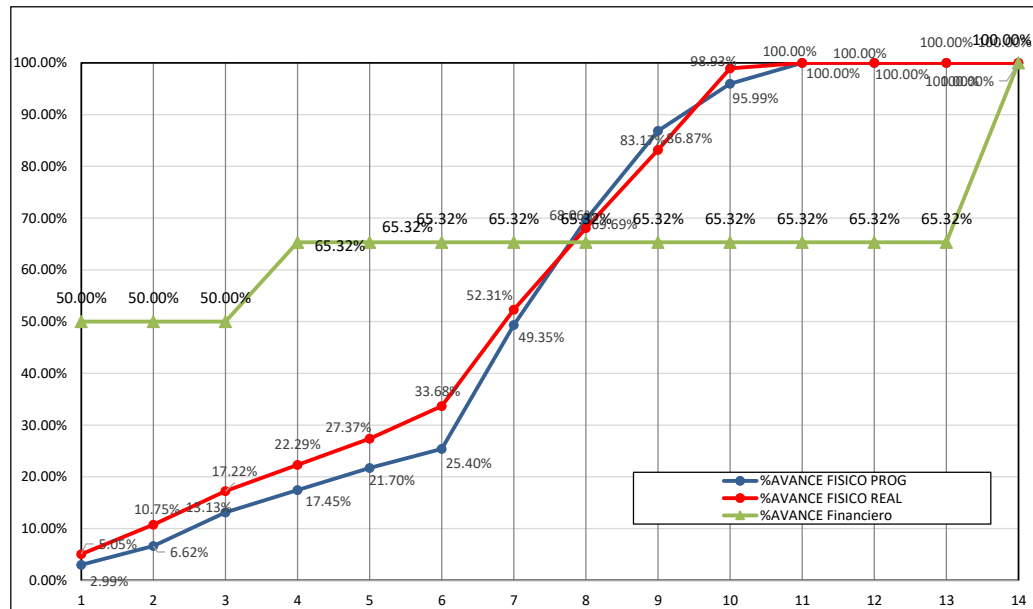

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
