


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| Obra: | PF 001 N/2025 ANTEPROYECTO, CONCEPTUAL, LOTIFICACIÓN Y TRAZO GEOMETRICO DE URBANIZACIÓN PARA PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,; | | | | |
| Ubicación: | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Contrato: | PF 001 N/2025 | | |
| Tipo de inversión: | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 | Contratista: | ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ | | |
| Programa: | U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. | Inicio Vigente: | miércoles, 27 de agosto de 2025 | Días de Obra: | 180 |
| Subprograma: | 03 SERVICIOS | Inicio Real: | miércoles, 27 de agosto de 2025 | Monto Contratado: | \$ 416,920.12 |
| Residente: | ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES | Fin Vigente: | domingo, 22 de febrero de 2026 | Monto Ejercido: | |
| | | Fin Real: | domingo, 22 de febrero de 2026 | | |

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 30/08/2025 | 9.73% | 9.73% | 0.00% |
| 2 | 30/09/2025 | 32.55% | 32.55% | 0.00% |
| 3 | 30/10/2025 | 70.96% | 70.96% | 17.25% |
| 4 | 30/11/2025 | 92.48% | 92.48% | 61.07% |
| 5 | 30/12/2025 | 94.71% | 94.71% | 91.56% |
| 6 | 30/01/2026 | 98.88% | | |
| 7 | 28/02/2026 | 100.00% | | |
| 8 | 30/03/2026 | 100.00% | | |
| 9 | 30/04/2026 | 100.00% | | |

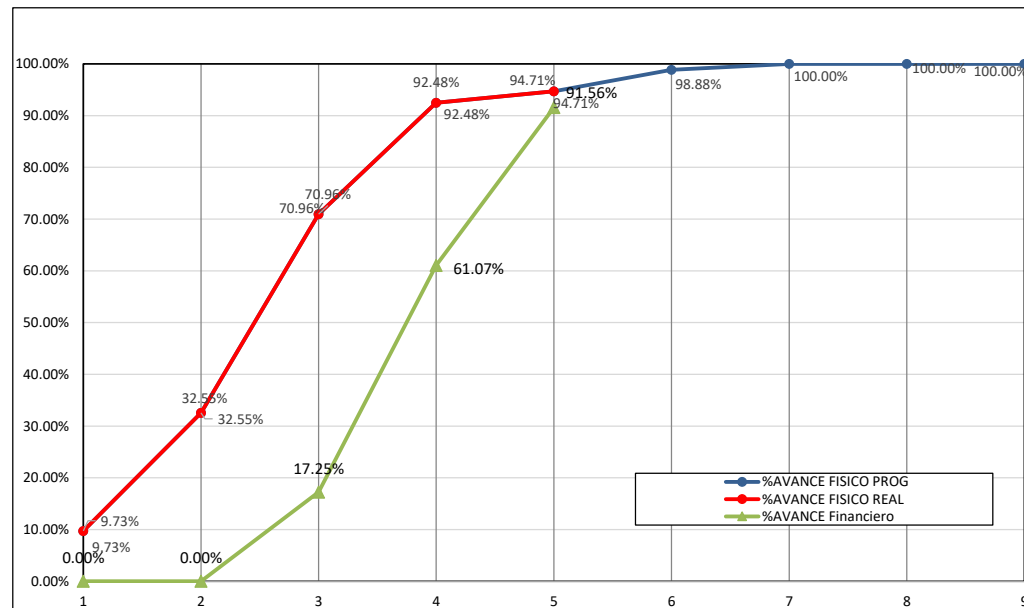

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
