

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001/2025 - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).;

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 001 B/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: JESUS ADRIAN CASTILLO SERNA,

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: viernes, 21 de marzo de 2025

Días de Obra: 280

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: viernes, 21 de marzo de 2025

Monto Contratado: \$ 266,800.00


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: jueves, 25 de diciembre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/03/2025	0.00%	0.00%	0.00%
2	20/04/2025	0.00%	0.00%	0.00%
3	20/05/2025	0.00%	0.00%	0.00%
4	19/06/2025	16.01%	16.01%	0.00%
5	19/07/2025	33.96%	33.96%	0.00%
6	18/08/2025	42.94%	42.94%	33.97%
7	17/09/2025	51.92%	51.92%	33.97%
8	17/10/2025	70.00%	70.00%	42.94%
9	16/11/2025	76.86%	76.86%	42.94%
10	16/12/2025	76.86%	76.86%	42.94%
11	15/01/2026			

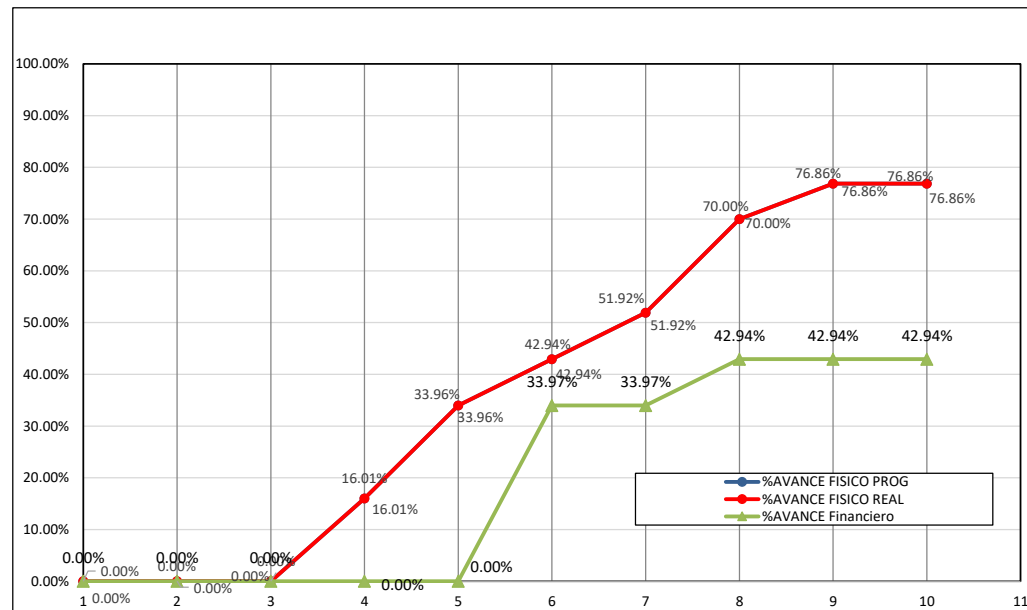

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
