

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001/2025 - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA);

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 001 C/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: CONSTRUCCIONES DISEÑART, S.A. DE C.V.

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: jueves, 20 de marzo de 2025

Días de Obra: 280

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: jueves, 20 de marzo de 2025

Monto Contratado: \$ 266,800.00


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: miércoles, 24 de diciembre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 24 de diciembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/03/2025	0.00%	0.00%	0.00%
2	19/04/2025	2.28%	2.28%	0.00%
3	19/05/2025	4.85%	4.85%	0.00%
4	18/06/2025	25.43%	25.43%	19.71%
5	18/07/2025	48.52%	48.52%	45.36%
6	17/08/2025	61.34%	61.34%	45.36%
7	16/09/2025	74.17%	74.17%	45.36%
8	16/10/2025	87.00%	87.00%	45.36%
9	15/11/2025	87.00%	87.00%	71.01%
10	15/12/2025	87.00%	87.00%	71.01%
11	14/01/2026			

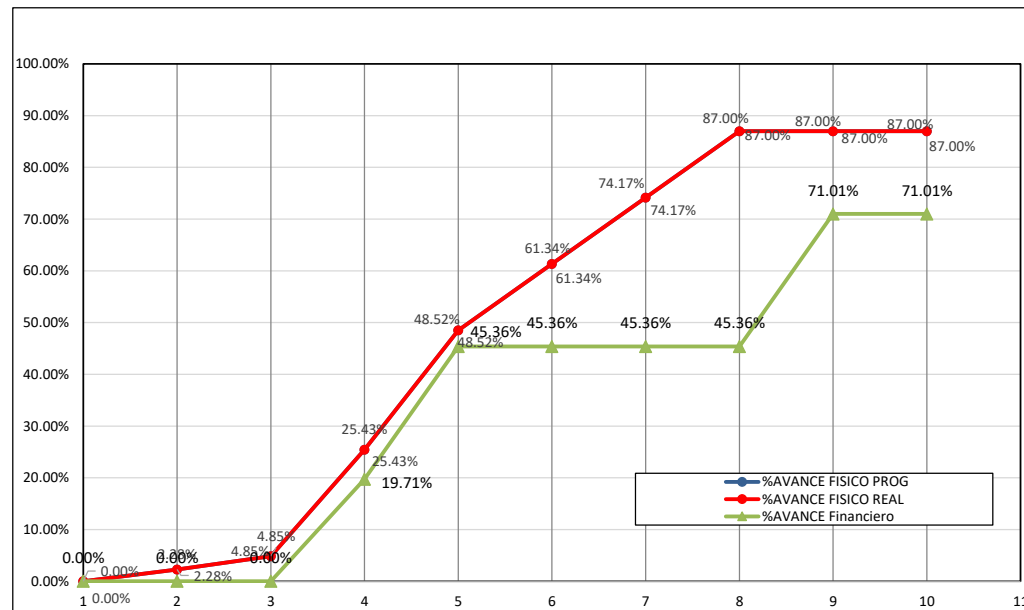

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
