


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001D/2025 TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS COMUNIDADES MACARIO J. GÓMEZ Y EX VIÑEDOS GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.;				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 D/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	martes, 8 de abril de 2025	Días de Obra:	30
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	martes, 8 de abril de 2025	Monto Contratado:	\$ 226,403.00
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	miércoles, 7 de mayo de 2025	Monto Ejercido:	\$ 226,403.00
		Fin Real:	miércoles, 7 de mayo de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/04/2025	17.68%	17.68%	0.00%
2	19/04/2025	18.68%	18.68%	0.00%
3	26/04/2025	86.50%	86.50%	0.00%
4	03/05/2025	91.49%	91.49%	0.00%
5	10/05/2025	100.00%	100.00%	100.00%
6	17/05/2025	100.00%	100.00%	100.00%

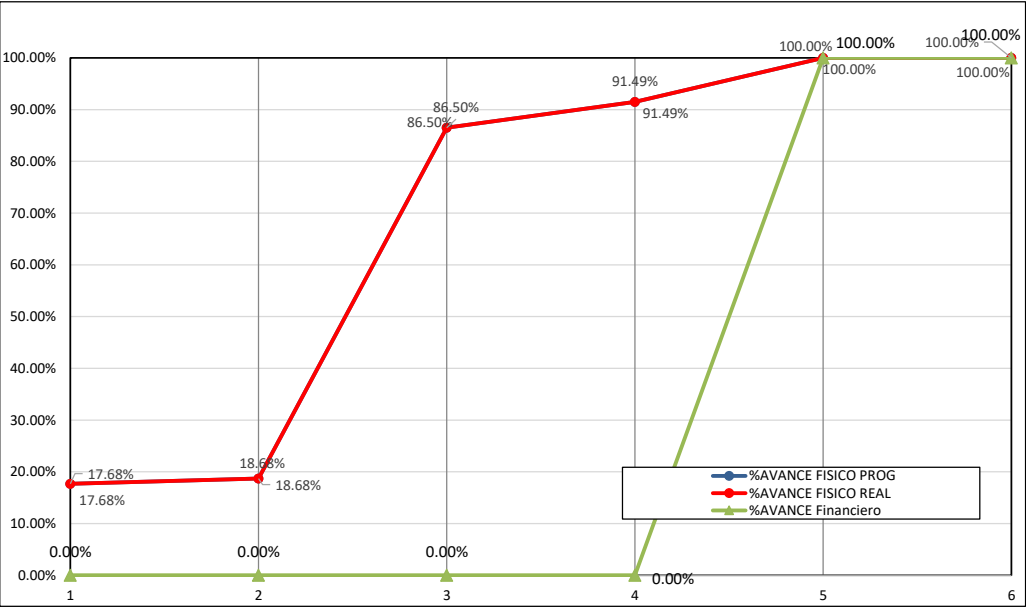

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
