


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 E/2025 TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE AGUASCALIENTES Y LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.;		
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 E/2025
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	martes, 29 de abril de 2025
Subprograma:	03 SERVICIOS	Días de Obra:	21
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Inicio Real:	martes, 29 de abril de 2025
		Fin Vigente:	lunes, 19 de mayo de 2025
		Fin Real:	lunes, 19 de mayo de 2025
		Monto Contratado:	\$ 99,481.21
		Monto Ejercido:	\$ 99,481.21

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/04/2025	11.60%	11.60%	0.00%
2	10/05/2025	69.29%	69.29%	0.00%
3	17/05/2025	91.72%	91.72%	0.00%
4	24/05/2025	100.00%	100.00%	100.00%

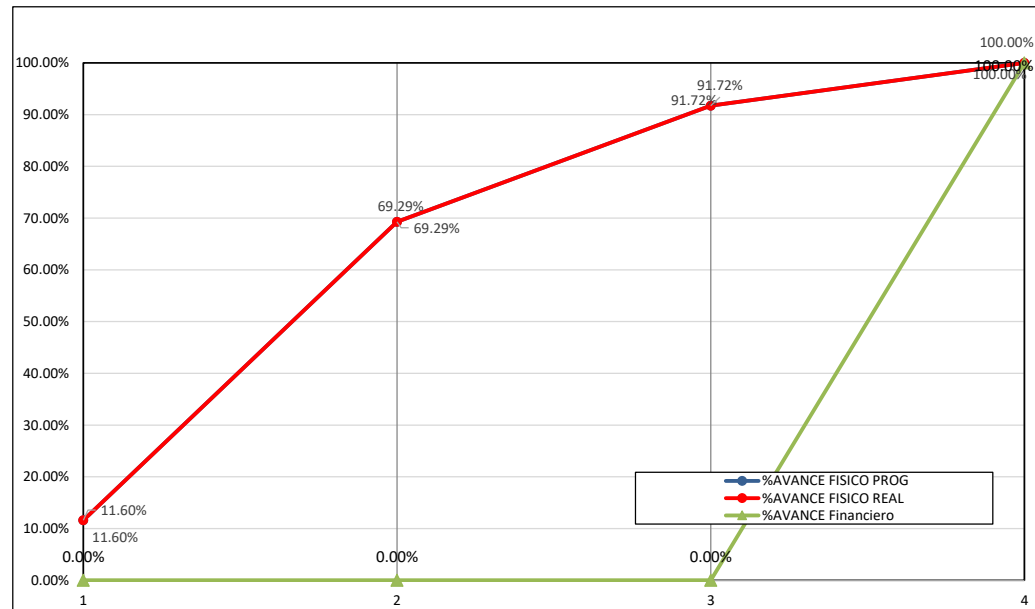

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
