


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 F/2025 PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 F/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ TOLEDO		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	sábado, 24 de mayo de 2025	Días de Obra:	60
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	sábado, 24 de mayo de 2025	Monto Contratado:	\$ 109,662.08
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	martes, 22 de julio de 2025	Monto Ejercido:	\$ 109,662.08
		Fin Real:	martes, 22 de julio de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2025	11.66%	11.66%	0.00%
2	07/06/2025	23.34%	23.34%	0.00%
3	14/06/2025	35.01%	35.01%	0.00%
4	21/06/2025	46.70%	46.70%	0.00%
5	28/06/2025	58.34%	58.34%	0.00%
6	05/07/2025	70.11%	70.11%	77.76%
7	12/07/2025	80.10%	80.10%	77.76%
8	19/07/2025	91.66%	91.66%	77.76%
9	26/07/2025	100.00%	100.00%	100.00%

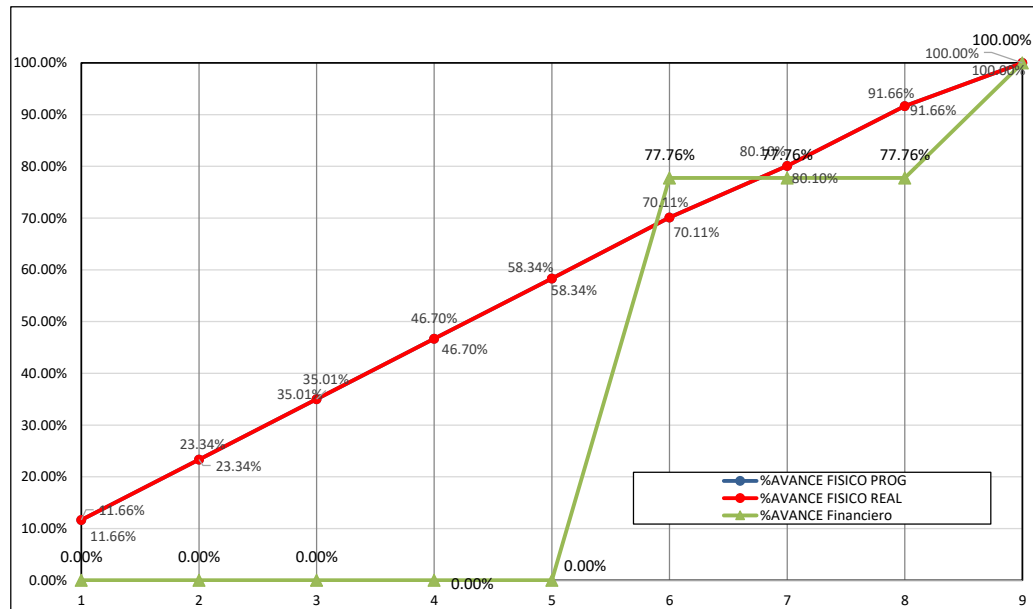

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
