


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 G/2025 PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, CALLE LORETITO LADO ORIENTE Y CALLE VIÑEDOS RIBIER, PUERTECITO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 G/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	SAGUE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	miércoles, 21 de mayo de 2025	Días de Obra:	60
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 21 de mayo de 2025	Monto Contratado:	\$ 141,487.22
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	sábado, 19 de julio de 2025	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	sábado, 19 de julio de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2025	11.47%	11.47%	0.00%
2	15/06/2025	30.09%	30.09%	0.00%
3	30/06/2025	47.74%	47.74%	0.00%
4	15/07/2025	93.00%	93.00%	0.00%
5	30/07/2025	100.00%	100.00%	0.00%
6	14/08/2025	100.00%	100.00%	100.00%

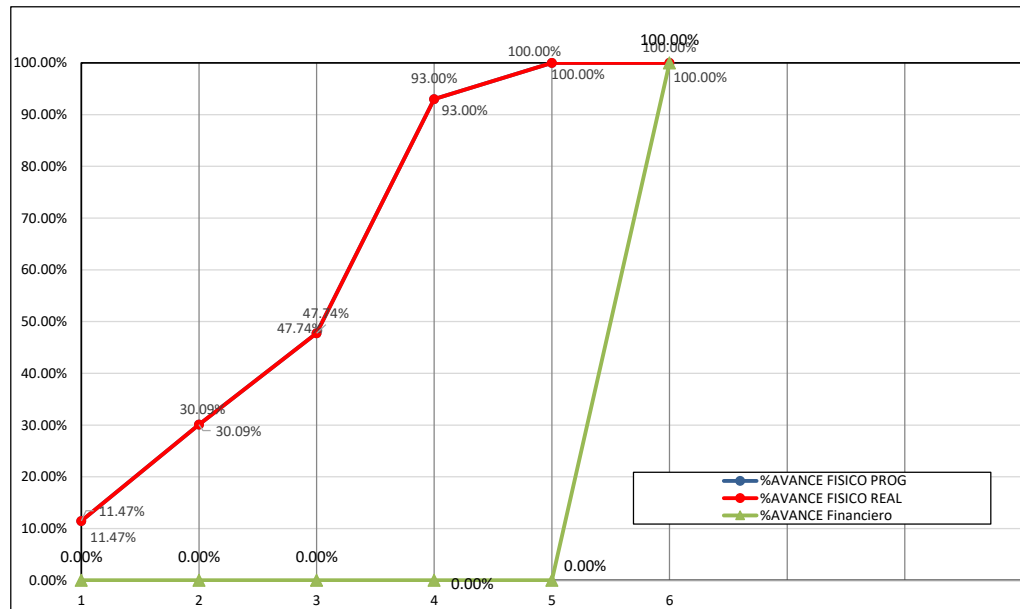

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
