


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 H/2025 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 H/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	sábado, 17 de mayo de 2025	Días de Obra:	45
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	sábado, 17 de mayo de 2025	Monto Contratado:	\$ 97,664.27
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	lunes, 30 de junio de 2025	Monto Ejercido:	\$ 97,664.27
		Fin Real:	lunes, 30 de junio de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/05/2025	33.95%	33.95%	0.00%
2	31/05/2025	47.77%	47.77%	0.00%
3	07/06/2025	57.87%	57.87%	57.87%
4	14/06/2025	70.69%	70.69%	57.87%
5	21/06/2025	83.51%	83.51%	57.87%
6	28/06/2025	96.34%	96.34%	57.87%
7	05/07/2025	100.00%	100.00%	100.00%
8	12/07/2025	100.00%	100.00%	100.00%

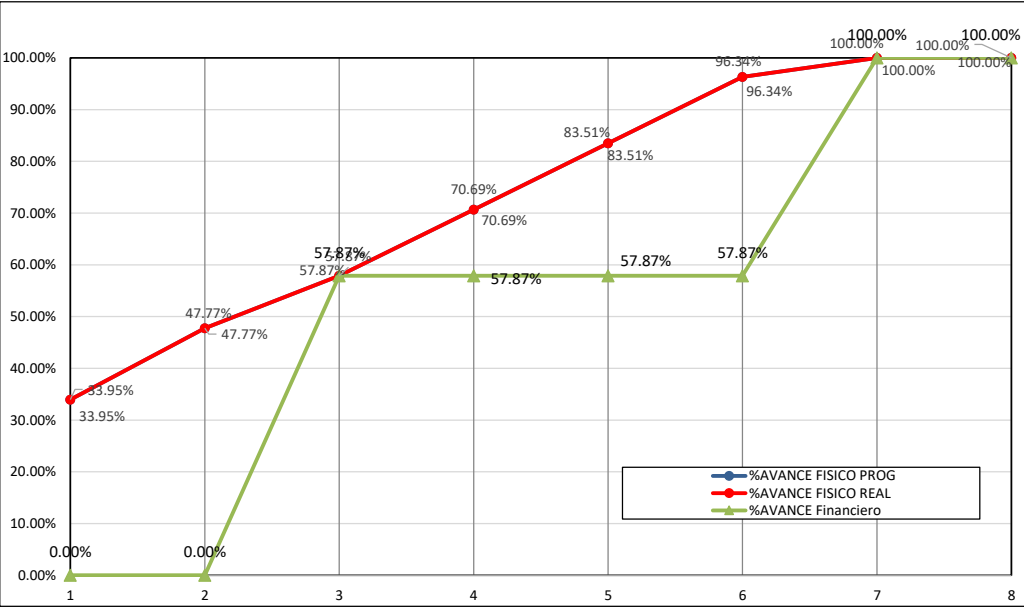

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
