


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001 I/2025 PROYECTO EJECUTIVO DE LA REMODELACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 001 I/2025		
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	HULME ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	miércoles, 4 de junio de 2025	<b>Días de Obra:</b>	60
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	miércoles, 4 de junio de 2025	<b>Monto Contratado:</b>	\$ 280,799.80
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Fin Vigente:</b>	sábado, 2 de agosto de 2025	<b>Monto Ejercido:</b>	
		<b>Fin Real:</b>	sábado, 2 de agosto de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/06/2025	22.06%	22.06%	0.00%
2	04/07/2025	50.82%	50.82%	0.00%
3	19/07/2025	75.97%	75.97%	0.00%
4	03/08/2025	100.00%	100.00%	0.00%
5	18/08/2025	100.00%	100.00%	100.00%

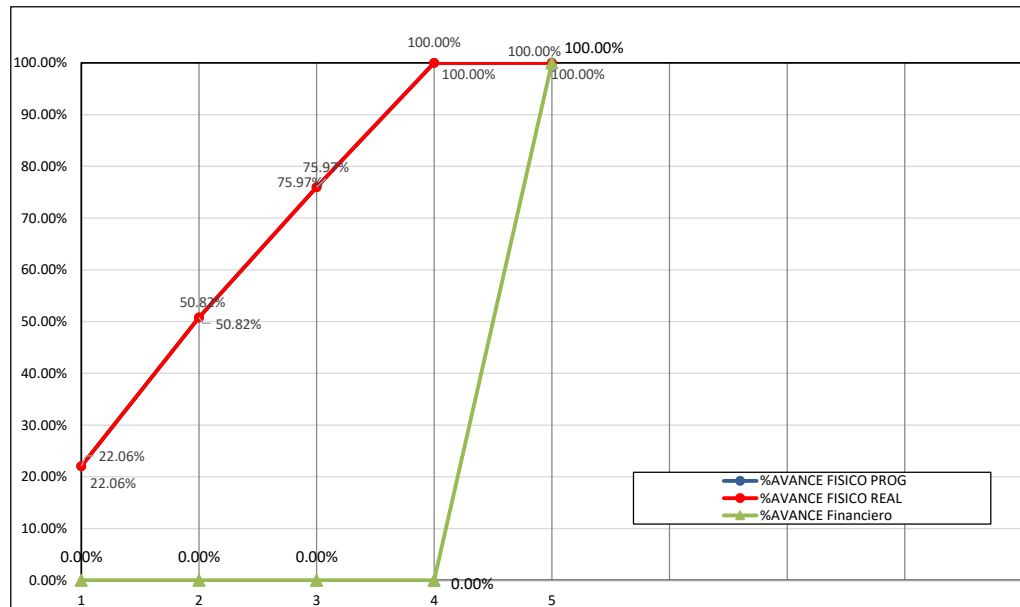

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
