


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 K/2025 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 3 OBRAS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CONCEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA EN CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO).: **Contrato:** PF 001 K/2025
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contratista:** JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ,
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Inicio Vigente:** martes, 17 de junio de 2025 **Días de Obra:** 180
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Real:** martes, 17 de junio de 2025 **Monto Contratado:** \$ 225,243.00
Subprograma: 03 SERVICIOS **Fin Vigente:** sábado, 13 de diciembre de 2025 **Monto Ejercido:**
Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/06/2025	10.52%	10.52%	0.00%
2	17/07/2025	13.56%	13.56%	0.00%
3	16/08/2025	16.60%	16.60%	0.00%
4	15/09/2025	36.24%	36.24%	0.00%
5	15/10/2025	36.24%	36.24%	0.00%
6	14/11/2025	43.83%	43.83%	0.00%
7	14/12/2025	58.91%	58.91%	49.80%
8	13/01/2026			
9	12/02/2026			

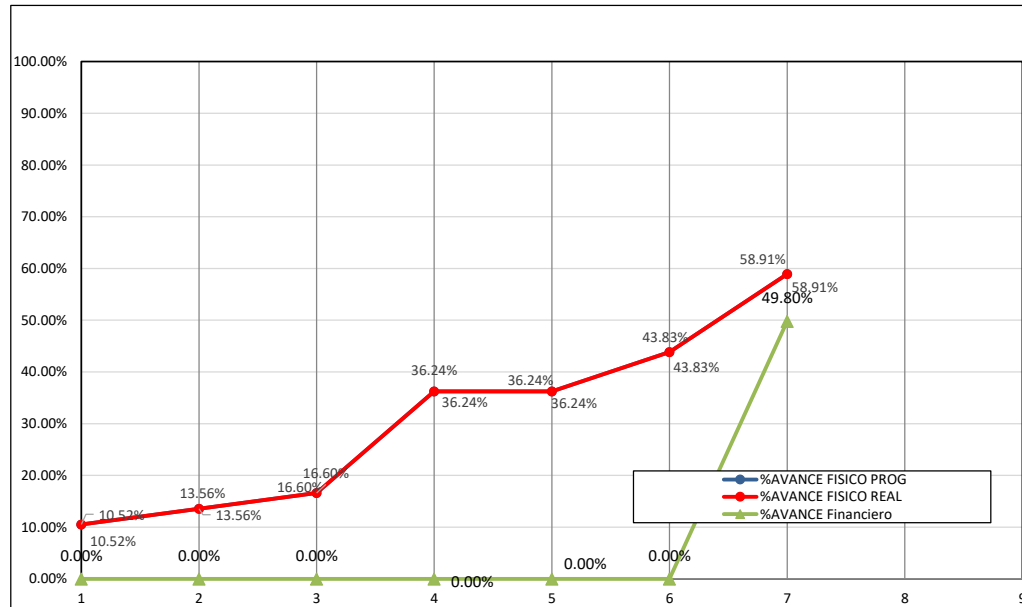

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
